



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

**Agencia Suiza para el Desarrollo  
y la Cooperación COSUDE**



Gestión Ambiental  
en la  
Minería Artesanal

# Informe Anual

2008



## INDICE

<b>1. INTRODUCCIÓN</b>	
<b>1.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO.....</b>	<b>2</b>
<b>1.2 SITUACIÓN ACTUAL DE ENTORNO.....</b>	<b>3</b>
<b>2. RESULTADOS Y DIFICULTADES.....</b>	<b>4</b>
<b>3. SUBPROYECTOS Y ACCIONES PROPIAS.....</b>	<b>8</b>
<b>4. COMPARACIÓN CON MATRIZ DE OBJETIVOS PROPUESTOS EN EL POA 2008.....</b>	<b>10</b>
<b>5. RESUMEN FINANCIERO.....</b>	<b>10.</b>
<b>6. LECCIONES APRENDIDAS.....</b>	<b>12</b>
<b>7. RECOMENDACIONES.....</b>	<b>13</b>
<b>8. ANEXOS.....</b>	<b>13</b>

# PROYECTO GAMA

## Informe Anual 2008

### 1.- Introducción

#### 1.1 Situación actual del proyecto.

Sustentado en el Acuerdo Bilateral entre los Gobiernos de Suiza y Perú, de fecha nominal 03 de Noviembre del 2005, suscrito en Enero del 2006, y en el contrato de mandato N° 7F-00032.04.01 (Vertrag Nr. 81006309) firmado entre COSUDE y Projekt Consult GmbH; el proyecto GAMA prosiguió con la ejecución del tercer año de su tercera y última fase.

La tercera fase del proyecto tiene como objetivo fundamental *“difundir de manera sostenible las experiencias y los conocimientos adquiridos en gestión empresarial, técnico-Ambiental y socio organizativo”*.

Como parte de la estrategia de salida, se ha desarrollado un proceso de gestión de conocimientos. Dentro de esta estrategia se contempla la ampliación del universo de beneficiarios, incorporando activamente a las mujeres mineras artesanales, lo cual se refleja en la formulación de los objetivos específicos para el año 2008.

Siendo el 2008, año de cierre del Proyecto GAMA, se definieron los siguientes objetivos:

*“Reforzar la convergencia de las líneas de acción priorizadas, con los componentes transversales, orientándolos a la sistematización de los resultados y experiencias acumuladas hasta la fecha y a la visibilización de los aportes de las mujeres en las comunidades mineras y en el ejercicio de sus derechos y acceso a oportunidades.”*

*“Llevar a cabo el cierre operativo y financiero del Proyecto GAMA”.*

La programación de actividades, como expresión de acciones concretas en las comunidades minero artesanales: se encuadró dentro de las tres líneas de acción prioritarias:

- Línea de acción 1: Ambiental Técnico,
- Línea de acción 2: Socio Económico,
- Línea de acción 3: Socio Organizativo

así como de los dos ejes transversales que se interrelacionan con las tres líneas de acción, antes enunciadas.

- Eje transversal: Género
- Eje transversal: Gestión de conocimientos y Plataforma TIC.

Los objetivos y actividades de la tercera fase y específicamente del año 2008, encuadraron dentro del marco lógico del Proyecto que contempla:

**El objetivo superior** del proyecto es “Contribuir a la reducción de la pobreza y al desarrollo sostenible en las zonas de minería artesanal en el Perú.”

El proyecto en su diseño inicial aporta sobre todo al logro de los siguientes Objetivos del Milenio (ODM):

- ODM 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
- ODM 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
- ODM 3: Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer

**El objetivo del proyecto** es “mejorar la situación social, ambiental y económica de la minería artesanal, contribuyendo de tal forma al desarrollo sostenible en las zonas donde se realiza ésta actividad en el Perú”.

**La estrategia principal** del proyecto GAMA es la de revertir el círculo vicioso en que se encontraba la minería artesanal al momento de la planificación e inicio del proyecto, hacia un círculo virtuoso, donde condiciones adecuadas posibiliten la integración de la minería artesanal en el sector de la economía formal.

Se mantuvo la intervención simultánea a niveles micro y macro, según demandas y oportunidades coyunturales.

## 1.2.-Situación actual del entorno

Al inicio de las actividades del Proyecto GAMA en los años 1999/2000, la en ese entonces inexistente legalmente, denominada “minería informal”, se encontraba concentrada casi exclusivamente en los departamentos de: Madre de Dios, Puno, Ica, Ayacucho, Arequipa, Puno y La Libertad, con unas 30,000 personas dedicadas a esta actividad de subsistencia en condiciones de extrema pobreza, debido a una sofocante red de dependencias y cotizaciones del oro debajo de 300 US\$/oz.

Actualmente las cotizaciones del Oro fluctúan entre 700 a 850 US\$/oz, Oro, que si bien es cierto han disminuido con referencia a los mayores valores históricos alcanzados hasta el tercer trimestre del 2008 (entre 900 a 1000 US\$/oz.) constituyen la excepción y continúan siendo buenas, con respecto a la baja espectacular de otros metales (cobre, Zinc plata etc.). lo cual unido a que todavía no se ha solucionado cabalmente el problema de falta de empleo; han originado un incremento de la población minero artesanal, que conservadoramente se estima entre 90,000 a 100,000 personas en todo el territorio nacional.

La transferencia de competencias respecto a la pequeña minería y minería artesanal a los Gobiernos Regionales, dentro del proceso de descentralización en el Perú, determina que estos se constituyan en el eslabón más importante para atender la problemática de la minería artesanal,

La voluntad política actual, del Ministerio de Energía y Minas, en su condición de ente rector del sector, lo ha llevado a aprobar un Proyecto Especial de Minería Artesanal, con el objeto de fortalecer capacidades en los Gobiernos Regionales; el mismo que tendrá un periodo de duración de cuatro años a partir de Enero 2009, con un presupuesto total del orden de los US\$ 6,000,000 (seis millones de dólares americanos) que prevé además acciones de remediación de pasivos ambientales de la actividad minera artesanal.

A fin de capitalizar la experiencia de GAMA, el Ministerio de Energía y Minas(MEM), los Gobiernos Regionales contraparte, la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República y los mineros y mineras artesanales; han tomado la iniciativa de solicitar a COSUDE una fase de salida para que el Proyecto pueda transferir las capacidades necesarias a los actores , asegurar la sostenibilidad de las acciones realizadas así como la réplica y ampliación de las experiencias a otras regiones priorizadas por el MEM y los Gobiernos Regionales que corresponda.

## **2.- Resultados y dificultades**

Tratándose del informe anual del último año (tercero) de la fase 3 del Proyecto GAMA, a la par de exponer los resultados y dificultades evidenciados en el 2008, se hace también un recuento de los resultados más relevantes registrados durante la vigencia contractual del Proyecto (2000-2008) y de las dificultades encontradas que representan un reto por afrontar.

El proyecto GAMA durante su gestión ha desarrollado propuestas e implementado y optimizado experiencias técnico-ambientales y empresariales, mejorando la situación e imagen de la minería artesanal en las zonas priorizadas del proyecto (Regiones de Ica, Arequipa, Ayacucho y Puno) y entre sus resultados más relevantes se tiene:

1. Legalización de la minería artesanal que se logró mediante la incidencia política para la formulación y promulgación de la Ley N° 27651-“Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal” y su respectivo Reglamento el D.S. 013-2002-EM, marco jurídico que permitió el reconocimiento oficial de la existencia de ese subsector y la posibilidad de su inclusión en la economía formal accediendo así a derechos y obligaciones.

Esto se consiguió por la confluencia de un favorable contexto político en ese momento, la naciente organización regional de los mineros artesanales que hizo suya la propuesta, la discusión y mejora de esa propuesta con diversos actores públicos y privados involucrados en el tema y una adecuada armonización de capacidades con el equipo GAMA.

2. Construcción de consensos mediante la implementación exitosa de Mesas de diálogo y negociación para solucionar conflictos de informalidad de larga data en la minería artesanal actuando GAMA como interlocutor imparcial válido para que las partes en conflicto (titulares de concesiones y mineros artesanales), dialoguen con participación de las autoridades sectoriales nacionales y regionales en la búsqueda de soluciones concertadas y sostenibles de mutuo beneficio. Este proceso pone especial atención a la adecuada relación y fluida comunicación entre los dirigentes mineros y sus representados así como también a los requerimientos de capacitación y asesoría organizativa y técnica que van surgiendo.

Con ese enfoque y metodología se logró resolver el más antiguo y emblemático conflicto de la minería informal peruana, en la mina La Rinconada de la Región Puno ( unos 20,000 habitantes). Los mineros se organizaron empresarialmente y luego de un largo camino de negociación llegaron al acuerdo de compra-venta de las acciones y acreencias de la empresa titular de las concesiones mineras pasando así a la condición de socios y acreedores mayoritarios de la empresa, con lo cual se ha sentado firmes bases para la formalización de esa zona

Teniendo como referente esa experiencia, otras organizaciones en condiciones parecidas están optando por ese mecanismo de formalización. Merece citarse el caso de los mineros de Muccumayo ( unos 3,000 habitantes) en la provincia de Carabaya-Puno quienes con apoyo de GAMA, durante el proceso de diálogo y negociación con el titular, fueron capacitados y asesorados para formar sus empresas y finalmente suscribieron un contrato de compra-venta de un porcentaje de las acciones de la empresa titular siendo ahora socios de la misma.

3. Implementación de tecnologías de información y comunicación (TIC) en comunidades minero-artesanales que contribuye al desarrollo sostenible de capacidades en dichas comunidades. La instalación de telecentros en dos comunidades mineras permitió la introducción del uso de TICs en las diversas zonas mineras a partir de la iniciativa privada de los propios mineros y en algunos casos de los gobiernos locales distritales. Sobre esa base GAMA ha desarrollado un amplio plan de apoyo en el equipamiento y sobretodo en la capacitación, con particular incidencia a Asociaciones de mujeres mineras artesanales.

Se ha creado la Plataforma de Gestión de Conocimientos - GECO (<http://geco.mineroartesanal.com>) que reúne información de tipo legal, organizativo, técnico, ambiental y diversos otros tópicos relacionados a

la minería artesanal y constituye una herramienta de información que hay que mantener y potenciar para una eventual capacitación a distancia.

12 comunidades mineras acceden a Internet ya sea mediante los telecentros apoyados por GAMA o por convenios de “telecentrización” suscritos con particulares propietarios de cabinas de Internet, involucrándolas en el proceso de acceso a gestión de conocimientos a través de la plataforma GECO, cuya página registra unas 20,000 visitas al mes.

4. Promoción de la organización empresarial y gremial de los mineros artesanales con enfoque de empoderamiento que contribuye a la prevención de conflictos y buena gobernabilidad al permitirles legalizarse y contar con canales de diálogo y propuesta hacia las autoridades.

Se incrementó el número de organizaciones de mineros artesanales, de sólo cuatro empresas en el ámbito de acción de GAMA, al inicio del proyecto; a 150 empresas y asociaciones existentes actualmente, El número de productores minero artesanales inscritos en el Registro Administrativo del Ministerio de Energía y Minas, se incrementa anualmente en 20 %.

5. Disminución de la contaminación ambiental por mercurio mediante una mejora tecnológica (Retorta Comunal) que fue validada en la primera fase y difundido su uso en la segunda y tercera. La retorta comunal cuenta con la confianza y aceptación de los mineros artesanales por lo que permite lograr un alto grado de recuperación de mercurio.

Se han implementado 15 retortas comunales en el ámbito del Proyecto, 3 de las cuales con aporte financiero del Gobierno Regional de Arequipa y que en conjunto que recuperan unos 1,300 Kgs de mercurio al año.

6. Desarrollo de capacidades para el uso de tecnologías limpias y sistemas de trabajo eficientes y seguros que se ha traducido en estándares de “buenas prácticas” asumidos en la minería artesanal del ámbito de acción de GAMA .

Se han registrado 92 intervenciones durante la vigencia efectiva de GAMA mediante Subproyectos y acciones propias (14 en el 2008) que han incidido con mayor frecuencia en aspectos técnicos mineros y cuidado del medio ambiente,(40) así como en aspectos socio organizativos(22),Legal administrativos (14), gestión empresarial (11) y otros de carácter transversal(9), todos ellos en 30 asentamientos minero artesanales ,**Anexos:** 1. Por modalidad de intervención,2.- por regiones

y modalidad de intervención , 3.- por fases y tabla consolidada de intervención en las tres fases

7. Se ha incidido en hacer visible la participación de las mujeres en el proceso de desarrollo y formalización de la minería artesanal y apoyar sus iniciativas de organización local y encuentros regionales lo que les está permitiendo mejorar su situación y posición en las comunidades mineras artesanales.

Existen 10 organizaciones de mujeres (empresarias, pallaqueras, comités ambientales) que están perfeccionando el trámite de inscripción de su ente gremial regional en Registros Públicos.

8. La sistematización de una parte de la experiencia de GAMA se ha traducido en las siguientes publicaciones:
  - Sobre Prevención de conflictos: “La Luz al final del túnel”.
  - Sobre Estrategia de Empoderamiento: “Nosotros hacemos los Pueblos”
  - Sobre Resolución de Conflictos: “Construyendo Consensos” La Rinconada (versiones en español e ingles).
  - Sobre el marco legal de la minería artesanal: y descentralización “Compendio Legislativo, Minería Artesanal y descentralización”
  - Sobre capacitación técnica-ambiental para minería artesanal: “Manual del Minero Artesanal”( en prensa)

En cuanto a las dificultades que se ha debido enfrentar y que de alguna manera han limitado el accionar del Proyecto deben mencionarse las siguientes:

- La voluntad política oscilante de las autoridades sectoriales a nivel central y regional ha limitado la continuidad de acciones y una mayor sinergia de recursos y capacidades para lograr una mayor amplitud y profundidad de resultados. Este factor ha determinado inclusive la no ejecución del proyecto por un total de un año y diez meses durante la primera y segunda fase.
- La transferencia de competencias a gobiernos regionales sin la correspondiente asignación de recursos económicos y de capacidades en el tema de minería artesanal ha limitado la participación económica de algunas contrapartes regionales del Proyecto y en algunos casos también la coordinación operativa debido a la gran movilidad de de los funcionarios regionales.
- La espectacular subida del precio del oro unida a la estructural escasez de puestos de trabajo en el país determinaron que en forma masiva e incontrolable sectores desocupados se volcaran a realizar actividad minera artesanal de manera informal en muchas regiones del país generando situación conflictivas y fuerte rechazo de parte de la minería formal y el Estado. Esta circunstancia ha minimizado a nivel de la opinión pública los avances logrados por los mineros artesanales



formalizados. Pero, de otro lado, finalmente ha obligado al Estado a empezar a definir é implementar políticas y acciones para lograr la formalización y control de la minería informal.

- Existe una insuficiente oferta de prestadores de servicios diversos especializados en minería artesanal, sobre todo a nivel de las regiones lo que constituye una barrera para el desarrollo empresarial. Aquí resulta muy necesaria la alianza de Estado, Universidades, Gremios Empresariales y la Cooperación Internacional para conjugar esfuerzos que permita incidir en el desarrollo de proveedores de servicios.
- Aparente estancamiento en el fortalecimiento institucional de las organizaciones regionales de los mineros artesanales. Existen dirigentes que ha ganado representatividad y mucha experiencia ejerciendo un liderazgo personal que si bien es funcional puede resultar muy vulnerable para la sostenibilidad las organizaciones actuales.

### **3.- Subproyectos y acciones propias:**

La implementación operativa de los planes de fase o anuales se realiza mediante “**actividades propias**” o mediante “**subproyectos**”, cuya diferenciación radica en el origen de la propuesta..Las “actividades propias” corresponden a iniciativas del equipo del Proyecto, que se consideren pertinentes para el logro de los objetivos esperados y los “subproyectos” parten de una solicitud de los beneficiarios.

En algunos casos, solicitudes de subproyectos pueden convertirse en actividades propias, si la solución a un problema específico, requiere una intervención más directa por parte del equipo del Proyecto. En otros casos si la propuesta demanda poca inversión y urgente implementación se tiene las denominadas **microacciones**.

En el año 2008, se realizaron 14 intervenciones (entre subproyectos, actividades propias y micro acciones relevantes) , cuyo resumen se expone en el siguiente cuadro:

## DETALLE DE SUB-PROYECTOS Y ACCIONES PROPIAS GAMA 2008

Contrato	Subproyecto	Beneficiarios	Monto	Ejecutado	Ejecutado	Situación
	Mdy N Mucumayo	Mineros Rinconada	S/ 4,617	S/. 5,446	\$ 1,855	Concluído
C-2007.40	Minera Ballón		S/ 37,710	S/. 15,379	\$ 5,222	Concluído
C-2008.1	Instalación Retorta Comunal	C.M Secocha	S/ 23,990	S/. 21,312	\$ 7,310	Concluído
C-2008.11	Planificación Minería Artesanal	GR/GLs/min art.	S/ 9,060			
C-2008.11A			S/ 12,560			
C-2008.11-I			S/ 880			
C-2008.11-III			S/ 6,580	S/. 30,561	\$ 10,482	Concluído
C-2008.12A	Talleres Capacitación-Puno	Mineros/Carabaya	S/ 26,575	S/. 26,575	\$ 9,486	Concluído
C-2008.13A	Capacitación en Rinconada	Molinos/Rinconada	S/ 17,511	S/. 11,942	\$ 4,397	Concluído
C-2008.14	Encuentro "Comercio Justo"	Mineros artesanales	S/ 2,177	S/. 2,177	\$ 782	Concluído
C-2008.15	Consolidación organiz/mujeres	Organizaciones base				
C-2008.15-I	Consolidación organiz/mujeres	Organizaciones base	S/ 9,600	S/. 8,862	\$ 3,008	Concluído
C-2008.17	Descentralización yGA en GRs	Gobiernos regionales	S/ 2,750	S/. 3,579	\$ 1,230	Concluído
C-2008.19	Capac.Minera Ramis GR-Puno	Poblac.cuenca/Ramis				Anulado
C-2008.19-I	Capac.Minera Ramis GR-Puno	Poblac.cuenca/Ramis	S/ 28,377	S/. 11,351	\$ 3,898	Concluído
C-2008.20	Inventario Centros Mineros Art.	Centros min.artesan.				
C-2008.20A	Inventario Centros Mineros Art.	Centros min.artesan.	S/ 41,470	S/. 41,470	\$ 14,856	Concluído
C-2008.24	Taller Liderazgo y Organización	Mujeres de 4 Horas	S/ 590	S/. 3,822	\$ 1,288	Concluído
C-2008.25	Materiales p.Retorta Comunal	Pob./Santa Filomena	S/ 5,000	S/. 5,152	\$ 1,667	Concluído
C-2008.27	Capacitación Seguridad Minera	Empresa FIDAMI S.A	S/ 1,085	S/. 1,226	\$ 395	Concluído
C-2008.30	Elaboración de guía	Mineros artesanales	S/. 3,000	S/ 3,000	\$ 970	Concluído
<b>SUB-TOTAL SUB-PROYECTOS</b>					<b>\$ 66,846.00</b>	
<b>IGV</b>					<b>\$ -1,089</b>	
<b>Devoluciones</b>					<b>\$ -3,817</b>	
<b>TOTAL SUB-PROYECTOS</b>					<b>\$ 61,940</b>	

Como puede apreciarse en el cuadro resumen se abordaron diversos aspectos temáticos tales como:

- **Resolución de conflictos:** Como el caso exitoso de la Mesa de Dialogo Negociación en el área de Mucumayo ( distritos de Ituata y Ayapata) en la provincia de Carabaya de la Región Puno, que culminó, en esta etapa ; con la suscripción del contrato de transferencia de acciones del titular minero a dos grupos de mineros artesanales organizados en un consorcio y corporación minera respectivamente, sentándose las bases para alcanzar el gran objetivo de la formalización integral..
- **Capacitación técnica minero-ambiental,** como en los casos de Minera Ballón, Mineros de Ayapata, Mineros de Ananea en la cuenca del rio Ramis,. Quimbaletos de Cerro Lunar y La Rinconada y empresa Fidami SA. Difundiendo tecnologías limpias y métodos de explotación seguros, adecuados a la escala productiva de la minería artesanal
- **Retortas comunales:** como en los casos de Secocha y Asociación de contratistas mineros artesanales de Santa filomena (en este último caso con financiamiento parcial en el rubro de materiales dado que la construcción del local y de las obras civiles de la retorta fueron por cuenta de los beneficiarios)
- **Apoyo a gobiernos regionales:** Como en el caso de la Planificación de la minería artesanal en la Región Arequipa que representa una acción inicial de abordar de manera sistemática y concertada, entre distintas instancias gubernamentales, tanto regionales como distritales ; la problemática y las oportunidades que representa la minería artesanal en sus respectivas circunscripciones.
- **Consolidación de la organización de las mujeres minera artesanales:** Se avanza en el proceso de la organización del ente gremial de las mujeres

artesanales nucleadas en el denominado Sur medio, pero con expectativas nacionales. Este subproyecto fue ejecutado directamente por las mujeres mineras artesanales con el acompañamiento de GAMA, la Autoridad Ambiental de la Región Arequipa y el eventual asesoramiento horizontal de AMASUC y de algunos consultores para temas puntuales ( Taller de liderazgo, elaboración de estatutos, etc.)

**- Inventario de centros mineros artesanales con intervención de GAMA:**

Un resumen georeferenciado, con planos superpuestos al Catastro minero, Mapas Geológicos y Áreas reservadas de todos los centros mineros artesanales donde ha intervenido GAMA así como de los eventos nacionales y regionales donde este ha tenido rol protagónico. Igualmente se han elaborado fichas técnicas que además de consignar la información georeferencial de los distintos centros minero artesanales, derechos mineros propios o afectados; ofrecen información sobre los aspectos temáticos de intervención, estimados de población involucrada, de la calidad y volumen de producción entre otros.

#### **4.- Comparación con matriz de objetivos propuestos en el POA 2008**

**Anexos:** Líneas de acción 1, 2, 3

#### **5.- Resumen financiero**

Si bien es cierto se alcanzo un promedio de ejecución presupuestal del 96%, en terminos generales se explican las ejecuciones presupuestales que estan por encima del 100 % o por debajo del 90%

En el rubro de **remuneraciones del personal**, el exeso se explica, en todos los casos; por el pago de vacaciones truncas al momento de liquidacion del personal por finalización del Proyecto y las vacaciones pendientes son explicables a su vez, por el reducido personal cuyas funciones por razones de especialización no posibilitaban un adecuado reemplazo por periodos vacacionales

En el año 2008 no se presupuesto para **consultorías nacionales**

En el rubro **costos directos, en los items pasajes, vialticos y gastos de viaje**, se registro una sensible desactivación de las actividades de subproyectos y otras comisiones de trabajos de campo a partir de Agosto 2008, para estar en condiciones de cerrar operativa y financieramente los subproyectos y por lo tanto las actividades se limitaron al seguimiento de los proyectos en curso sin admitir nuevas solicitudes.

En el rubro de **infraestructura local**, nuestras proyecciones segun informe financiero de Octubre 2008 sin reestructuración y e incluso antes, nos obligaron a adoptar extremas medidas de austeridad para equilibrar los items de Gastos de operación, Oficina materiales, Mantenimiento y reparación de equipos y Gastos de operación del vehículo que alcanzaban porcentajes de 102%, 109% y hasta 147%. La reestructuración del presupuesto en octubre del 2008, sirvio para equilibrar estos gasos pero ya no fue posible ejecutar a cabalidad los nuevos montos asignados.

En el rubro otros **gastos fiduciarios** los items talleres y TIC, alcanzaron niveles bajos de ejecución por las razones de disminución del ritmo de actividades de campo ya explicadas anteriormente para el primer caso y en lo referente a gestión de conocimientos, tomar en cuenta que el rubro publicaciones se exedió ligeramente hasta alcanzar el 103% y ambas partidas tenían orientaciones similares de difundir las sistematizaciones efectuadas,. De otro lado estas partidas también se incrementaron con la reestructuración presupuestal de octubre del 2008 y ya no se tenía mucho tiempo para una ejecución más efectiva.

## INFORME FINANCIERO AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2008

**DISPONIBLE AL 01.01.2008**

Bancos y Caja		26,864
Cuentas por cobrar		5,487
Cuentas por pagar		-10,740
<b>TOTAL</b>		<b>21,612</b>

**INGRESOS 2008**

Transferencias PC		237,000
<b>TOTAL</b>		<b>237,000</b>

**EGRESOS 2008**

Presupuesto del Servicio	POF USD	POA 2008 USD	EJECUTADO USD	% USD
<b>COSTOS DIRECTOS internacional</b>				
<b>COSTOS directos (personal)</b>				
<b>Viajes internacionales (residentes y familia)</b>				
Pasajes internacionales (asesor residente y familia)	4,800	1,296		0%
Mudanza al fin de periodo residente	4,000	154		
Vuelos anuales a país de origen	3,200	(448)		
<b>Subtotal</b>	<b>12,000</b>	<b>1,002</b>	-	
<b>Costos de estadia de personal residente</b>				
Vivienda	19,200	-		
Educación de hijo	7,000	-		0%
<b>Subtotal</b>	<b>26,200</b>	-	-	
<b>Subtotal</b>	<b>38,200</b>	<b>1,002</b>	-	
<b>Presupuesto Fondos Fiduciarios</b>				
<b>COSTOS DEL PROYECTO</b>				
<b>Remuneración personal local</b>				
<b>Personal del proyecto</b>				
Jefe Nacional del Proyecto	144,500	51,008	56,145	110%
Gerenta de operaciones	107,300	36,652	38,999	106%
Secretaria	46,200	15,943	17,383	109%
Contadora (tiempo parcial)	5,350	20	-	0%
Servicios Generales	47,300	15,979	16,623	104%
Limpieza y jardín	12,800	4,304	3,927	91%
<b>Subtotal</b>	<b>363,450</b>	<b>123,906</b>	<b>133,077</b>	
<b>Consultores nacionales o regionales (andinos)</b>				
Expertos	19,900	26		0%
<b>Subtotal</b>	<b>19,900</b>	<b>26</b>	-	
<b>COSTOS DIRECTOS (nacional/regional-andino)</b>				
<b>Viajes</b>				
Pasajes nacional/regional-andino	9,000	2,529	1,538	61%
Viaticos y gastos viaje consultores	600	81	-	0%
Viaticos y gastos viaje de personal del proyecto	21,400	6,508	3,043	47%
<b>Subtotal</b>	<b>31,000</b>	<b>9,118</b>	<b>4,581</b>	
<b>Infraestructura local</b>				
Oficina: alquiler	19,600	8,026	7,356	92%
Oficina: gastos de operación	13,900	5,074	3,114	61%
Oficina: materiales	4,500	1,712	1,259	74%
Oficina: mantenimiento y reparación equipos	6,800	1,872	1,928	103%
Vehículo: gastos de operación	24,000	8,444	6,354	75%
<b>Subtotal</b>	<b>68,800</b>	<b>25,128</b>	<b>20,011</b>	
<b>Compra de equipos</b>				
Adquisición de equipos de oficina	100	21		0%
<b>Subtotal</b>	<b>100</b>	<b>21</b>	-	
<b>Terceros</b>				
Auditoria local	19,000	13,500	11,973	89%
<b>Subtotal</b>	<b>19,000</b>	<b>13,500</b>	<b>11,973</b>	
<b>OTROS FONDOS FIDUCIARIOS</b>				
<b>Otros fondos fiduciarios</b>				
Adquisición de material de proyecto	1,200	24	-	0%
Talleres, eventos, seminarios, reuniones, etc.	13,000	4,683	2,507	54%
Gestión de conocimiento (plataforma TIC)	72,000	20,033	15,292	76%
Publicación e diseminación	21,000	15,175	15,580	103%
Subproyectos	194,500	62,391	61,939	99%
Fortalecimiento Gobiernos Regionales	18,000	3,758	3,407	91%
<b>Subtotal</b>	<b>319,700</b>	<b>106,064</b>	<b>98,726</b>	
<b>Subtotal</b>	<b>821,950</b>	<b>277,763</b>	<b>268,367</b>	
<b>Total Egresos</b>	<b>860,150</b>	<b>278,765</b>	<b>268,367</b>	<b>96%</b>
<b>Ingresos</b>				
Eventual venta de inventario al cierre del proyecto	(35,265)	(10,700)	(10,800)	
Otros ingresos (*)	-	-		
<b>Subtotal</b>	<b>(35,265)</b>	<b>(10,700)</b>	<b>(10,800)</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>824,885</b>	<b>268,065</b>	<b>257,567</b>	<b>96%</b>
Gastos administrativos Projekt Consult	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>824,885</b>	<b>268,065</b>	<b>257,567</b>	<b>96%</b>
IGV por cobrar 2008			8,909	

**DISPONIBLE AL 23.12.2008**

Bancos y Caja	-
Cuentas por cobrar igv	-
Cuentas por cobrar	738
Cuentas por pagar	-
Transferencia cierre cuentas bancos	5,885
<b>TOTAL</b>	<b>6,623</b>

**RESUMEN**

DISPONIBLE AL 01.01.2008	21,612
Transferencias PC	237,000
IGV POR COBRAR PERIODO 2007	15,281
IGV POR COBRAR PERIODO 2008	(-) 8,909
DIFERENCIA CAMBIO 2008	(-) 794
EGRESOS 2008	(-) 257,567
PROYKT CONSULT	(-) -
DISPONIBLE AL 23.12.2008	(-) 6,623
	-0

## 6.- Lecciones aprendidas

- Los primeros logros impactantes (promoción de la organización y empoderamiento de los mineros artesanales y la aprobación de la Ley que permitió su legalización) posicionaron al Proyecto GAMA como interlocutor válido tanto a nivel de los mineros artesanales como de las autoridades, situación que en las sucesivas fases fue acentuándose gracias al efecto positivo y repercusión de los sub-proyectos ejecutados por GAMA y a la toma de conciencia de los mineros y mineras artesanales de la necesidad de formalizarse y hacer sostenible y rentable su actividad.
- El alto grado de transparencia y participación en la presentación, evaluación, aprobación y seguimientos de las propuestas y sub-proyectos así como su experiencia en el desarrollo de capital social minero artesanal han sido otros elementos que ha posicionado a GAMA como un referente en el tema de minería artesanal del Perú.
- La falta de una política clara y efectiva para la minería artesanal tanto de parte de las autoridades a nivel central como regional, en un contexto de alza sostenida del precio del oro tuvieron como consecuencia que sectores desempleados se volcaran masivamente en diferentes regiones del país a realizar minería artesanal de manera informal generándose conflictos locales y una imagen negativa de la minería artesanal. La suma de la voluntad política de las autoridades y los recursos y capacidades desarrolladas por los proyectos exitosos de la cooperación constituye un aspecto decisivo para potenciar los logros obtenidos por la cooperación y hacerlos sostenibles.
- La propuesta de promover el uso de tecnologías de información y comunicación (TICs) para y desde la población minera artesanal caracterizada por encontrarse en lugares muy distantes y de difícil acceso tuvo que enfrentar dificultades de diverso tipo y fue diseñado finalmente como un sistema participativo de gestión de conocimientos basado en TICs, con componentes de (i) contenido, (ii) capacitación y (iii) conectividad.  
Los telecentros implementados en las comunidades mineras de Santa Filomena en Ayacucho y Cerro Lunar en Puno tuvieron un lento proceso de consolidación hasta lograr ser autónomos, autosuficientes y rentables, sirviendo también como referentes para que los mineros artesanales de las diferentes localidades y comunidades instalen como iniciativa privada cabinas de Internet en otras 10 comunidades. Incentivar la iniciativa privada es la gran lección para aspirar a la sostenibilidad de esta iniciativa.
- La visibilización de la presencia e importancia de las mujeres en la vida de las comunidades minero artesanales ha sido un objetivo de la línea transversal de género de GAMA, la presencia de las mujeres más allá de la esfera en la doméstica, ha tenido avances impulsados por las propias mujeres que se han organizado en asociaciones y conformado una organización a nivel del Sur Medio. Este paso adelante siendo solo un escalón en el camino que ya empezaron a recorrer, es muy importante pues les permite relacionarse entre ellas, compartir experiencias e iniciativas y desarrollar su capacidad de propuesta hacia el interior de sus comunidades y hacia las organizaciones y autoridades públicas.

## 7.- Recomendaciones

- a) La actual voluntad política de parte del Ministerio Energía y Minas para implementar un proyecto de apoyo a las regiones en aspectos de minería artesanal permitiría conjugar a nivel macro los esfuerzos del MEM, la Cooperación Canadiense, los gobiernos regionales y el Proyecto GAMA para diseñar e impulsar un plan nacional de formalización de la minería artesanal en las actuales zonas más críticas del país lo que hace necesaria una fase de transferencia de experiencias, metodologías y herramientas de GAMA al sector público. Esto implica una intervención de GAMA a nivel macro y meso.
- b) La plataforma Gestión de conocimientos GEKO, constituye una herramienta muy valiosa y con mucho potencial para ampliar la llegada y efectos de una intervención, por lo que sería recomendable que el equipo GAMA en la fase de salida pudiera asegurar su continuidad y evolución.
- c) Desde esa nueva posición y alianza con el sector público en la que se encontrará GAMA sería importante tender lazos con otras instituciones vinculadas a la minería para buscar niveles de conversación y compromisos entre todos los sectores de la minería peruana para la prevención de conflictos y asunción de obligaciones por parte de la minería artesanal tendientes a realizar, también; una actividad económica y ambientalmente sostenible.
- d) El trabajo de apoyo y capacitación a las mujeres mineras debería continuar , incluso a nivel de acciones micro durante la fase de salida de GAMA pues siendo este un sector muy postergado se requiere consolidar sus esfuerzos de organización y desarrollo y este es un espacio en el que aparentemente difícilmente actuarían los potenciales aliados.
- e) La capacitación horizontal de minero a minero ha sido un elemento emergente en la fase 3 de GAMA que ha demostrado mucho potencial y bajo costo por lo que debería ser considerada como una herramienta a ser utilizada y potenciada en adelante.

## 8.- Anexos

- Líneas de acción 1, 2, 3
- 1. Por modalidad de intervención, 2.- por regiones y modalidad , 3.- por fases y 4.- tabla consolidada de intervención en las tres fases
- Bitácora de actividades

Ver. 29-12-2008


LINEA DE ACCION 1 AMBIENTAL – TECNICO							
OBJETIVO	AÑO 2008		POF 3	Avances y resultados 2008	Resultados		
	Resultados	Indicadores			POA 2008		POF %Fase 3
					Nº	%	
Adaptar y difundir sistemas de trabajo y tecnologías limpias y eficientes en la minería artesanal, mejorando las condiciones de trabajo y salud de los mineros artesanales y de la población involucrada.	Propuestas validadas de GAMA, sobre sistemas de trabajo y tecnologías limpias están documentadas	4 Recomendaciones técnicas para 3 formas de contaminación (Hg, sólidos en suspensión y Cianuro)	10	-Para el Mercurio: "Retortas comunales" en Secocha y Santa Filomena	2	50	80
		Reducción de emisiones de mercurio en <b>1TM/año</b>	3 TM.	Gradual incremento operativo de 14 retortas comunales, posibilitan reducción de emisiones de Hg. en el lorden de los 1,300 Kg/año	1,300	130	110
	Mineros artesanales implementan, cada vez más; con aporte propio propuestas de GAMA.	Uso de tecnologías mejoradas en 6 comunidades minero artesanales	20	En los asentamientos mineros de Minera Ballón, La Rinconada mina y quimbaleteros, Fidami y Ramis	5	83.33	95
		Cambios tecnológicos con inversión propia en 2 comunidad minero artesanal.	5	En el asentamiento minero de Minera Ballón se esta empleando perforación neumática con compresoras estacionarias y tienen EIA, en proceso de evaluación	1	50	80

LINEA DE ACCION 2 SOCIO ECONÓMICO							
OBJETIVO	AÑO 2008		POF 3	Avances y resultados 2008	Resultados		
	Resultados	Indicadores			POA 2008		POF %Fase 3
					Nº	%	
Capacitar a los mineros artesanales para que puedan formalizarse.	Se ha resuelto conflicto y suscrito contrato en La Rinconada, Cerro lunar y aledaños en Puno y en otras comunidades minero artesanales del área de influencia de GAMA sistematizando y difundiendo experiencia	Suscripción del contrato de explotación en La Rinconada-Puno.	1	Se suscribió Acuerdo de transferencia de % mayoritario de acciones y cesión de acreencias a favor de central de cooperativas CECOMRIL, quienes asumen control de empresa.	1	100	100
		3 contratos de explotación en proceso y 3 suscritos	8	Hay 2 contratos de explotación suscritos,3 en proceso y unos 10 de acercamiento al diálogo	4	130	100
		títulos obtenidos por mineros artesanales	50	Hay mas de. <b>100 PMA</b> que son resultado de superar la informalidad y un número mayor por adecuación a escala y beneficios extensivos de la Ley de formalización facilitada por GAMA.	Meta superada	Meta superada	Meta superada
	Proceso de formalización continua Empresas existentes mejoran sus operaciones y se constituyen nuevas empresas	Gestión empresarial más eficiente en 3 operaciones minero artesanales	10	FIDAMI y Minera Ballón acusan una gestión empresarial, progresivamente más eficiente.	2	66	90




LINEA DE ACCION 3 SOCIO ORGANIZATIVO							
OBJETIVO	AÑO 2008		POF 3	Avances y resultados 2008	Resultados		
	Resultados	Indicadores			POA 2008		POF% Fase 3
					Nº	%	
Fortalecer y promover a nivel local, regional y nacional instituciones, organizaciones comunitarias y productivas en capacidad de gestión ambiental.	El sub-sector de la minería artesanal ha progresado en la consolidación de su nivel organizacional.	Se han consolidado en su nivel organizacional hasta un <b>50%</b> de las organizaciones minero artesanales existentes	90%	Existe <b>150</b> organizaciones minero artesanales entre asociaciones y empresas minero artesanales .La referencia porcentual se aplica con respecto las organizaciones que se van gestando durante la vigencia del Proyecto	Meta supe rada	Meta supe rada	Meta Alcanzada
	El nivel de participación de las mujeres en las organizaciones ha incrementado.	Existen unas <b>6</b> organizaciones de mujeres mineras artesanales funcionando y en proceso de coordinación en red.	20	<b>10</b> organizaciones de mujeres miera artesanales legalizadas inscripción en los Registros Públicos. Y esta por concluir trámite de inscripción de ente gremial	Organización gremial, que por el momento agrupa a 5 organizaciones de base		
	La plataforma TIC del proyecto es conocida entre los mineros artesanales y contribuye progresivamente para su capacitación y comunicación.	<b>2</b> cluster de comunidades minero artesanales del área de influencia de GAMA, cuentan con telecentros y acceden a plataforma TIC.	8	Hay acceso a Internet en Tulin, El Ingenio (Ica) Otoa, San Luis, Santa Filomena y Relave (Ayacucho), Mollehuaca, Cuatro Horas , Chaparra y Secocha (Arequipa), y La Rinconada. Y Cerro Lunar (Puno).	2	100	100
		Al final del año, en el <b>50%</b> de telecentros de mineros artesanales las operadoras responsables son mujeres	50	Los centros de cómputo municipal de Otoa e Ingenio son atendidos por mujeres, así mismo lo son el telecentro de Santa Filomena y la cabina de San Luis.		50	50
	Al final del año 50% de telecentros se autofinancian y funcionan de manera sostenible.	100	Los telecentros de Santa filomena y Cerro Lunar se están autofinanciando con dificultades, pero con avance respecto al ejercicio anterior		100	100	

Intervenciones Proyecto GAMA: 2001 – 2008  
Modalidades de Intervención

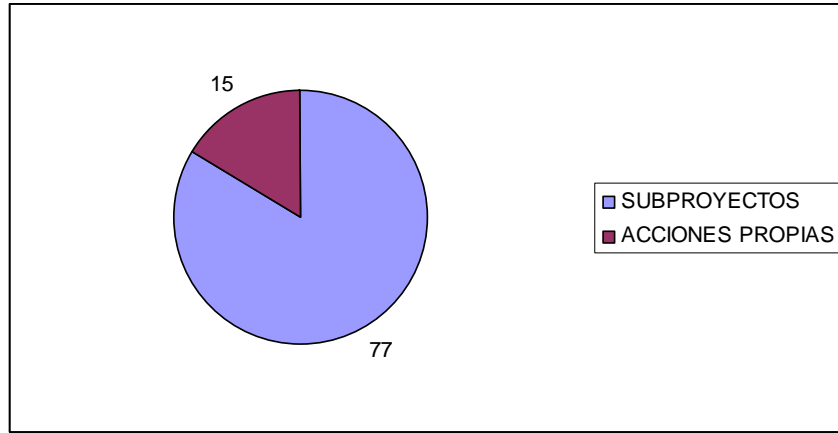

Intervenciones Proyecto GAMA: 2001 – 2008  
Por Regiones y modalidades de Intervención

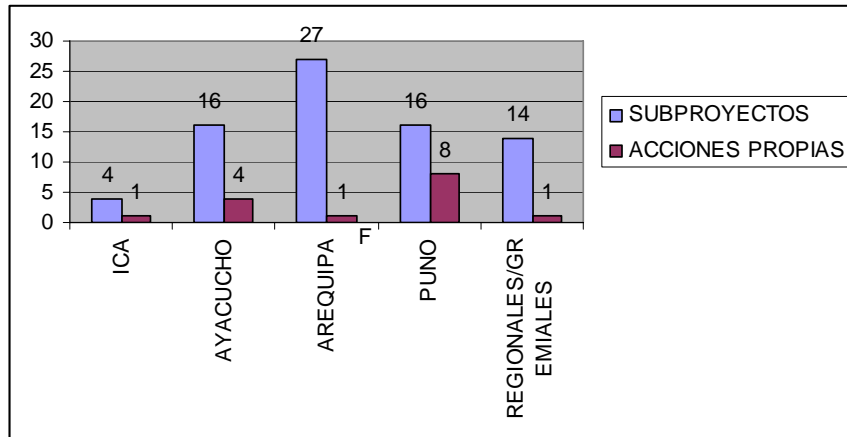

Intervenciones Proyecto GAMA: 2001 – 2008  
Por fases

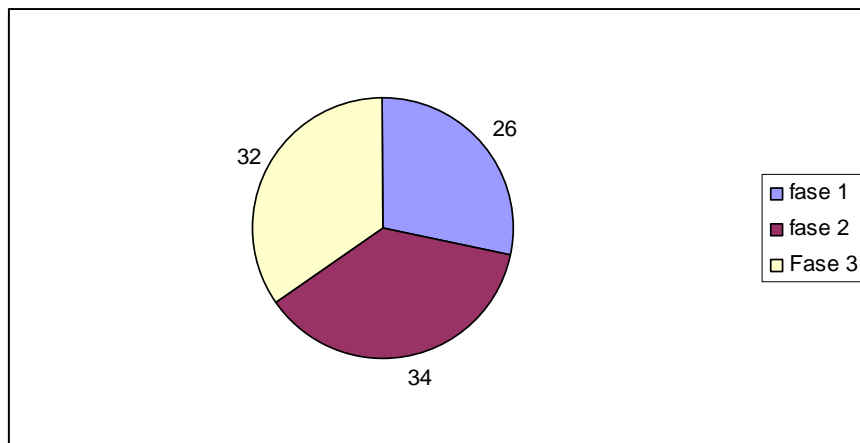


Tabla consolidada de intervenciones de GAMA en las tres fases

Lugar/Base minera	FASE 1	FASE 2	FASE 3
<b>REGIÓN</b>	<b>ICA</b>		
<b>Nasca</b>	- Apoyo Seminario UNICA		
<b>Sol de Oro:</b>		Capacitación sobre uso del mercurio	
<b>Tulín:</b>		Capacitación legal, técnica y ambiental	Retorta Comunal
<b>Saramarca</b>		Capacitación en legislación minera	

REGIÓN	AYACUCHO		
<b>Santa Filomena/ SOTRAMI</b>	-Diseño planta de beneficio artesanal  -Intercambio Mineros-Ecuatorianos	Capacitación en Seguridad y Ambiente	Fortalecimiento de capacidades de gestión
<b>Relave-AURELSA</b>	-Ayuda emergente por terremoto		Asesoría Técnica (Topog.-Geológ )
	-Fortalecimiento organizativo Aurelsa		
	Transformación Anexo Relave		
	- Asistencia -topográfica mina "Fe y Alegría"		
<b>Relave- EMARSA</b>		- Capacitación en gestión empresarial	
<b>Relave-MINERA BALLÓN</b>			Capacitación Técnico y seguridad
<b>Huanca</b>	-Retorta Comunal		
	-Fortalecimiento AMAH		
	-Quimbalete mejorado(1)	-Quimbalete mejorado (2)	
<b>San Luis:</b>		-Retorta Comunal	
		-Taller de Orfebrería-	Participación en feria de mujeres orfebres
<b>Santa Ana</b>			Capacitación técnica empresarial
<b>Otoca:</b>		Retorta Comunal	

Tabla consolidada de intervenciones de GAMA en las tres fases

REGIÓN		AREQUIPA	
<b>Mollehuaca</b>	Saneamiento físico-legal	- Módulos de Capacitación (1) _ Módulos de capacitación (2)	
		- Retorta Comunal (Parcial con GRA)	
<b>La victoria</b>	- Asistencia Topográfica		
<b>La Eugenia</b>		- Retorta comunal	
<b>Arequipa</b>	- Encuentro Regional de Mineros artesanales		
<b>Chaparra:</b>		- Sensibilización. y capacitación Ambiental	
		- Retorta Comunal (GRA)	
<b>La Lomada:</b>		- Capacitación empresarial, técnica. y comunitario	
<b>Cerro Rico Base Central</b>		- Retorta comunal	- Capacitación Empresarial, técnico ambiental-
			Ampliación de retorta comunal
<b>Base Rey</b>		- Retorta comunal	- Capacitación Técnico Ambiental
		- Módulos de Capacitación Rey	
<b>ADEMIC (4 horas)</b>		- Propuesta de apoyo legal	
<b>4 horas /MACDESA</b>		- Módulos de capacitación empresarial.. Y técnica.	
		- Fortalecimiento de capacidades de hombre y mujeres	
<b>GRA. (multiprovincial)</b>			Planificación minería artesanal
<b>Secocha</b>			Retorta comunal
<b>Choco</b>			Capacitación normativa y técnica
<b>San Cristobal</b>			Capacitación Institucional, seguridad y otros
<b>Chala</b>		-Capacitación de Dirigentes, Delegados y Bases - Retorta Comunal (GRA)	
<b>Misky</b>			- Retorta comunal
<b>Ispacas</b>			- Retorta Comunal
<b>Secocha</b>			- Retorta comunal

**Tabla consolidada de intervenciones de GAMA en las tres fases**

<b>INTERREGIONAL / Gremiales</b>			
<b>Interregional</b>	- Comunicación para la Minería Artesanal		Inventario minero artesanal-áreas de intervención de GAMA
	- Registro Administrativo Sur Medio y Norte		
	-Apoyo organizativo a bases mineras		
	_ Registro administrativo extensión Sur		
	- Apoyo comisión coordinadora Sur Medio		
<b>Gremial Mujeres mineras artesanales</b>		- fortalecimiento organizaciones. mujeres mineras	- Formación Organización Regional de Asoc. de Mujeres Mineras
			- Legalización de mujeres mineras artesanales
			Consolidación, organización y capacitación en mujeres mineras
<b>Gremial/ FENAMARPE</b>		Capacitación de bases mineras (multitemática)	- Capacitación de FENAMARPE
			- II Congreso Nacional: Estatutario y Organizativo
			- Periódico Minero Artesanal(3)
<b>Gremial AMASUC</b>		- Capacitación en procedimientos legal/administrativo	

Tabla consolidada de intervenciones de GAMA en las tres fases

REGIÓN	PUNO		
<b>Cecomsap/Anane</b>	-Planificación participativa	- Pilotaje tratamiento de morrenas en circuito cerrado	- Pilotaje tratamiento de morrenas en circuito cerrado
	-Capacitación ambiental		
<b>Cecomín-Aspromina</b>		Plan de Desarrollo Minero Integral	
<b>C° Lunar</b>	-Intercambio Mineros Bolivianos	Promoción y organización de mujeres mineras	
	-Módulos recapacitación		
<b>Puno</b>	-Encuentro departamental		
	-Registro Administrativo Puno		
<b>Untuca</b>		Apoyo en gestión ambiental	
<b>Puno/Regional</b>		Capacitación Equipo itinerante -	
<b>Rinconada y Cerro Lunar:</b>	-Censo minero artesanal	Proceso de formalización y MD y N.	Proceso de formalización yMD y N.
	Seguridad Minera y Primeros Auxilios		Capacitación empresarial y técnica
<b>Rinconada-Cerro San Francisco</b>		Retortas Móviles	
<b>Sina</b>		Capacitación en legislación minera	
<b>Girigachi</b>			Asesoramiento Y capacitación
<b>Carabaya</b>			Capacitación y formalización aspectos técnicos
<b>Mucumayo</b>			MD y N
<b>CENAQUIMP</b>			Capacitación y formalización
<b>Cuenca Ramis</b>			Convenio interinstitucional.

## Bitácora 2008

**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2008**  
(No se consigna Subproyectos, micro acciones ni acciones propias)

<b>ACTIVIDAD REALIZADA</b>	<b>RESULTADOS ALCANZADOS</b>
<b>Enero</b>	
Apoyo a líderes mujeres mineras del Sur Medio en viaje a principales comunidades minero artesanales para promover la legalización de las organizaciones de pallaqueras.	Promoción de la organización regional de las mujeres mineras del Sur Medio
Se formula el Plan Operativo Anual - POA 2008	Se cuenta con propuesta de documento que orienta la gestión anual de GAMA.
<b>Febrero</b>	
Boletín mensual Ecoaméricas publica artículo sobre minería artesanal en el Perú con material alcanzado por GAMA	Se difunde experiencia y opinión del Proyecto GAMA mediante boletín electrónico..
Visita de un funcionario de COSUDE-Berna a una comunidad minera artesanal en Perú.	El señor Dubois visitó la localidad de "Cuatro Horas" (Chaparra-Arequipa y pudo apreciar los avances apoyados por GAMA.
Gobierno Regional de Arequipa formula Ordenanza Regional sobre Minería Artesanal	Gobiernos Regionales empiezan a ejercer competencias normativas en el tema de minería artesanal.
<b>Marzo</b>	
Auspicio de documental sobre descentralización en la Región Puno	Se contribuyó difundir las ventajas de la descentralización
Capacitación en uso de TICs a 20 mujeres mineras de Samarca-Ica durante cuatro días.	Se realizó encuentro de mujeres mineras y el desarrollo de capacidades de sus lideresas.
Viaje del Jefe del Proyecto a Cuzco para asistir al Taller "Desarrollo con Inclusión" convocado por COSUDE	Debate sobre ese tema ayuda a mejorar enfoque de trabajo.
Reunión del Comité Directivo del Proyecto GAMA	Con las recomendaciones pertinentes, fueron aprobados el Informe Anual 2007 y el POA 2008. COSUDE señaló que, en vista al mayor involucramiento de autoridades nacionales y regionales, se podría considerar un período de ampliación de GAMA.
<b>Abril</b>	
Apoyo logístico y económico a las dirigentes de la Asociación de Mujeres Mineras del Sur Medio para visita a 11 bases.	Mejora el nivel de comunicación y coordinación entre las organizaciones de mujeres mineras.
Exposición de GAMA sobre minería artesanal en evento sobre el Día de la Tierra en la Universidad San Marcos	Se difunde en ambiente académico las oportunidades y desafíos que presenta la minería artesanal para el país.
Co-auspicio del Forum Descentralización y Gestión Ambiental en los Gobiernos Regionales	Se contribuye a la realización del evento que reunió a Gerentes de Recursos Naturales y Medio ambiente .
Exposición del Jefe del Proyecto en Forum realizado en Arequipa con asistencia de Gerentes Regionales de Medio ambiente.	Experiencia y logros de GAMA en cuatro regiones es difundida ante funcionarios ambientales a nivel nacional.
Participación en II Taller Regional de los pilotos de ARM (Comercio Justo de oro proveniente de minería en pequeña escala) y en Foro realizado en el Congreso de la República.	GAMA acompaña el proceso de los Pilotos de América Latina para la definición de estándares para Comercio Justo.
Participación en el coloquio sobre Minería Informal realizado en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú	La cooperación internacional, la pequeña minería y mineros artesanales intercambian enfoques y opiniones sobre el tema.
<b>Mayo</b>	
Viaje de la contadora del Proyecto a la comunidad de Santa Filomena para realizar el Inventario de activo físico TICs	Activo físico del telecentro de Santa Filomena verificado y Equipo directivo capacitado en manejo contable.
<b>Junio</b>	

Participación en la II Conferencia Internacional sobre pasivos ambientales realizada en Lima	Actualización en el debate de destacados expertos de Latinoamérica, Europa y Canadá, sobre la gestión público-privada de los pasivos ambientales mineros.
Taller de capacitación en comercialización del oro y de temas de género para mineros y mineras del Sur Medio.	Evento organizado en coordinación con el Gobierno Regional de Arequipa tuvo masiva concurrencia.
<b>Julio</b>	
Participación del jefe del Proyecto en el VII Congreso Nacional de Minería.	Problemática minero artesanal es difundida y debatida en evento nacional.
Visita del embajador de Suiza a la comunidad minera artesanal de Santa Filomena en Ayacucho.	Representante oficial de Suiza en el Perú conoce llega a una comunidad minera artesanal y verifica labor realizada por GAMA.
Publicación de Libro "Nosotros Hacemos los Pueblos... el Empoderamiento de la Minería Artesanal"	Investigación sobre la estrategia de empoderamiento implementada por el Proyecto GAMA en las localidades de Arequipa, Ayacucho y Puno es publicada.
Preparación de documentos y organización del Taller de Planificación de Plataforma de fase ampliatoria de GAMA	Coordinaciones con consultor internacional, recopilación de materiales, elaboración de documento, convocatoria y diseño del Taller realizados.
<b>Agosto</b>	
Participación de Jefe de Proyecto en Taller de divulgación de acciones GAMA en Piura	Región en la que recientemente ha crecido la actividad minera artesanal conoce actividades y logros de GAMA en el Sur Medio.
Se lleva a cabo el Taller de Planificación de Plataforma de la Fase Ampliatoria del Proyecto GAMA	Plataforma de la fase ampliatoria de GAMA es formulada por representantes de las regiones y otros actores relevantes.
Participación en el V Congreso Internacional de Mujeres Mineras en Trujillo.	Participación la información y debate sobre minería, responsabilidad social, género y desarrollo.
Diseño y elaboración de video de divulgación de la investigación "Nosotros hacemos los Pueblos..."	Se procesa material audiovisual que se difundirá con el libro.
Se empieza a procesar listados de activos y documentos operativos y otros de GAMA	Proceso de cierre iniciado.
<b>Setiembre</b>	
Participación de GAMA en evento por ARM (Asociación Minería Responsable) en Bolivia. sobre "La certificación: Medio de Acceso a Mercados Justos y a Financiamiento para la Minería Artesanal" realizado en Bolivia"	Avances en la coordinación y alianza con ARM.
Publicación de reportaje sobre GAMA en la Revista "Ingenieros de Minas". Edición 55	Se divulga en revista de prestigio especializada en minería, la actividad y logros de GAMA.
Participación en la reunión del sistema de monitoreo de la estrategia de COSUDE	Se inicia análisis y discusión sobre el tema.
Taller de Planificación de la Fase Ampliatoria 2009-2010, en la ciudad de Lima, con participación de representantes de gobiernos regionales y de COSUDE.	Se cuenta con documento "Plan de Acción de la Fase de Salida y Transferencia de la Experiencia del Proyecto GAMA al Ministerio de Energía y Minas y Gobiernos Regionales involucrados en el Proyecto"
<b>Octubre</b>	
Apoyo para la participación de mineros y mineras artesanales en evento de minería en pequeña escala en Brasil.	Mineras y mineros artesanales participan en la reunión anual del CASM, organismo del Banco Mundial especializado en minería en pequeña escala.
Se formuló el documento Plan Operativo de Fase de Salida 2009-2010	Se cuenta con documento normativo para el accionar en nueva fase de transferencia de experiencias al sector público.
Monitor de Subproyector y Plataforma GECO son revisados y actualizados.	Todo el material producido por los subproyectos, acciones propias y micro-acciones figura en esas herramientas TIC.
Se concluye sistematización sobre la experiencia de formalización de los mineros artesanales de La Rinconada en Puno.	Experiencia de formalización más importante y difícil realizada por el equipo GAMA lista para su impresión.
<b>Noviembre</b>	



Equipo directivo de Project Consult llega a Perú para coordinar acciones de cierre del Proyecto GAMA.	Se establece plan de acción de tramo final del cierre.
Presentación pública del Libro y Video "Nosotros Hacemos los Pueblos..." en la Universidad Católica del Perú.	Investigación promovida y financiada por GAMA sobre su experiencia de empoderamiento en la minería artesanal es presentada públicamente en el ambiente académico.
Realización de auditoría al Proyecto GAMA – Período 2008	Se audito período cierre parcial a Octubre 2008 y se concluirá diligencia en diciembre con cierre total actividades financieras.....
<b>Diciembre</b>	
Se formula cronograma de actividades finales de cierre del Proyecto GAMA	Responsabilidades y plazos establecidos para cumplir con el cierre de GAMA en todos los aspectos en la fecha prevista.
COSUDE-Berna aprobó la solicitud de crédito para la fase transitoria de 6 meses con cargo al apoyo al Proyecto especial de Minería Artesanal del MEM.	Podrá realizarse la Fase de transferencia de la experiencia de GAMA al MEM y gobiernos regionales con el mismo equipo humano.
Publicación del "Compendio de Legislación Minera Artesanal"	Normativa legal relacionada a la minería artesanal actualizada disponible para los mineros artesanales, personas e instituciones relacionadas al tema.
Publicación de Folleto "Construyendo consensos"	Sistematización de la experiencia de formalización de la actividad minero artesanal de La Rinconada en Puno es difundida.
Formulación del Informe Anual de actividades 2008	Último informe de actividades realizadas correspondiente a la Fase 3 de GAMA, presentado a COSUDE.
Actividades de cierre del Proyecto GAMA	Proceso con algunas actividades pendientes a concluirse en Enero 2009, respaldado con convenio privado entre Project Consult y Guillermo medima.
