


Informe Anual

2007



7F-00032.04.01,Vertrag Nr.81006309

 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación COSUDE

PROYECTO

GAMA



INDICE

1. Introducción	1
1.1 Situación actual del proyecto	1
1.2 Situación actual del entorno	2
2. Avances (resultados) y dificultades	2
2.1 Actividades propias	3
2.1.1 Construcción de consensos para la resolución de conflictos	3
2.1.2 Gestión de conocimientos y plataforma TIC	4
2.1.3 Investigación: Empoderamiento como estrategia de lucha contra la pobreza	7
2.1.4 Plan de acción dirigido a lograr la recuperación de la cuenca del Río Ramis	9
2.2 Subproyectos	9
2.3 Microacciones	11
2.4 Acciones complementarias en prevención de desastres	11
3. Comparación con matriz de objetivos propuestos en el POA 2007	11
4. Resumen Financiero	13
4.1 Aporte Suizo para 2007	16
4.2 Aporte Peruano para 2007	16
5. Lecciones aprendidas	16
6. Recomendaciones	16



1. Introducción

1.1 Situación actual del proyecto.

Sustentado en el Acuerdo Bilateral entre los Gobiernos de Suiza y Perú, de fecha nominal 03 de Noviembre del 2005, suscrito en Enero del 2006, y en el contrato de mandato N° 7F-00032.04.01 (Vertrag Nr. 81006309) firmado entre COSUDE y Projekt Consult GmbH; el proyecto GAMA prosiguió con la ejecución del segundo año de su tercera y última fase.

Con miras a la sostenibilidad del proceso de formalización y desarrollo, desencadenado por el proyecto GAMA; la tercera fase del proyecto tiene como objetivo fundamental *“difundir de manera sostenible las experiencias y los conocimientos adquiridos en gestión empresarial, técnico-Ambiental y socio organizativo”*.

Como parte de su estrategia de salida, para posibilitar que los conocimientos y experiencias adquiridos durante la ejecución del proyecto no solamente continúen aprovechándose, sino, incrementándose y ampliándose posteriormente a la terminación del proyecto; se inicio y desarrolla un proceso de gestión de conocimientos. Dentro de esta estrategia se contempla la ampliación del universo de beneficiarios, incorporando activamente a las mujeres mineras artesanales, lo cual se refleja en la formulación de dos objetivos específicos para el año 2007 que son:

“Converger las líneas de acción priorizadas con los componentes transversales, orientándolos a la sistematización de los resultados y experiencias acumuladas hasta la fecha, reforzando, incrementando y actualizando la plataforma de conocimientos ya implementada; mediante acciones participativas de todos los actores e interesados.

“Reforzar la visibilización de los aportes de las mujeres en las comunidades mineras y posibilitar el ejercicio de sus derechos y acceso a oportunidades.”

Las actividades se desarrollaron de acuerdo a lo previsto, siguiendo tres líneas de acción prioritarias

- Línea de acción 1: Ambiental Técnico,
- Línea de acción 2: Socio Económico,
- Línea de acción 3: Socio Organizativo

Así como dos ejes transversales que se interrelacionan con las tres líneas de acción, antes enunciadas.

- Eje transversal: Género
- Eje transversal: Gestión de conocimientos y Plataforma TIC

La viabilidad de las iniciativas presentadas se ha determinado en concordancia con el portafolio de actividades aprobado en la planificación de la fase

Los objetivos y actividades de la tercera fase y específicos del año 2007, encuadran dentro del marco lógico del Proyecto que contempla:

El objetivo superior del proyecto es “Contribuir a la reducción de la pobreza y al desarrollo sostenible en las zonas de minería artesanal en el Perú.”

El objetivo del proyecto GAMA es “mejorar la situación social, ambiental y económica de la minería artesanal, contribuyendo de tal forma al desarrollo sostenible en las zonas donde se realiza ésta actividad en el Perú”.

El proyecto en su diseño inicial aporta sobre todo al logro de los siguientes Objetivos del Milenio (ODM):

- ODM 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
- ODM 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Así mismo, en la fase 3 se prevé incrementar significativamente la pertinencia del proyecto relativo al:

- ODM 3: Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer

La estrategia principal del proyecto GAMA es la de revertir el círculo vicioso en que se encontraba la minería artesanal al momento de la planificación e inicio del proyecto, hacia un círculo virtuoso, donde condiciones adecuadas posibiliten la integración de la minería artesanal en el sector de la economía formal.

Se mantiene la intervención simultánea a niveles micro y macro, según demandas y oportunidades coyunturales.

1.2 Situación actual del entorno.

El año 2007 se ha caracterizado en el caso de la minería artesanal, por la concomitancia de dos hechos importantes, por un lado, las elevadas cotizaciones de los metales en mercado mundial, particularmente los casos del Oro y Cobre, que alcanzaron los más altos niveles históricos, con efectos ambivalentes dado que posibilitan incrementar los ingresos de los mineros artesanales y contribuir a elevar su calidad de vida y por otro lado el énfasis en dedicarse solo a producir, descuidando incluso las oportunidades de consolidar su formalización que les daría mejores opciones de aprovechar los tiempos de bonanza.

Lo expuesto en el párrafo precedente y las todavía precarias oportunidades de empleo ha dado lugar a la irrupción de una minería artesanal, con toda la carga negativa de informalidad; en la zona norte del país (particularmente en Piura, La Libertad, Cajamarca) y que parecieran desvirtuar los importantes avances y logros que se vienen registrando en lo que constituye el *proceso de formalización de la minería artesanal* como resultado de la legalización dentro del marco de la Ley N° 27651 y su respectivo reglamento DS N° O13-2002-EM (2002) y a los cuales viene contribuyendo de manera decisiva el proyecto GAMA.

En el aspecto político, las actuales autoridades ejecutivas del sector al igual que la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, muestran una mejor predisposición para afrontar la problemática de la minería artesanal/informal. De otro lado, instituciones representativas del quehacer minero nacional, como el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, tienen a la minería artesanal/informal dentro de su agenda de discusión y análisis.

2. Avances (resultados y efectos) y dificultades

La implementación operativa de los planes de fase o anuales se realiza mediante “**actividades propias**” o mediante “**subproyectos**”, cuya diferenciación radica en el origen de la propuesta. Las “**actividades propias**” corresponden a iniciativas del equipo del Proyecto, que se consideran pertinentes para el logro de los objetivos esperados y Los “**subproyectos**” parten de una solicitud de los beneficiarios.

En algunos casos, solicitudes de subproyectos pueden convertirse en actividades propias, si la solución a un problema específico, requiere una intervención más directa por parte del equipo del Proyecto. En otros casos si la propuesta demanda poca inversión y urgente implementación se tiene las denominadas microacciones.

2.1 Actividades propias

2.1.1 Construcción de consensos para la resolución de conflictos:

Caso La Rinconada y aledaños en Puno.

Uno de los conflictos más antiguos y emblemáticos de la informalidad minera artesanal en el Perú se daba en los centros mineros de la “La Rinconada” “Cerro Lunar” y aledaños en la Región de Puno, situados a 5,200 msnm y a unos 218 Km al N. de Puno, y en donde además de conflictos de propiedad con los titulares mineros (Corporación Minera Ananea) existe una compleja problemática de connotaciones ambientales, sociales, económicas, laborales, de salud, saneamiento y seguridad ciudadana entre otros.

La iniciativa para afrontar la problemática existente surgió en la Fase 2 de GAMA como un requerimiento formulado por tres cooperativas mineras de la localidad de conflicto (La Rinconada y Cerro Lunar-Puno). Esta propuesta tuvo a su vez una inmediata y favorable acogida por parte de Corporación Minera Ananea lo que facilitó la labor de intermediación del proyecto GAMA de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación-COSUDE.

Para facilitar el proceso se instaló, una Mesa de Diálogo y Negociación (MD y N.) que contó con la participación de la Gerencia de Recursos de Naturales y Medio Ambiente y la DREM de Puno, la Dirección de Conciliación extrajudicial y medios alternativos del Ministerio de Justicia y la presencia del MEM, en su condición de ente rector de la minería nacional.

El objetivo de la MD y N. fue lograr consensos básicos que posibilitaran relaciones armoniosas, de respeto mutuo y de confianza entre las partes, arraigando la idea de un proceso nuevo para lograr la convivencia pacífica y sustentable entre todos los actores, generando un escenario que posibilite afrontar gradual y sostenidamente la compleja problemática que representa la actividad minera artesanal en La Rinconada y aledaños.

Durante el desarrollo de la MD y N. que ha durado 3 años, se han realizado 12 sesiones ,8 de ellas han sido facilitadas por un consultor internacional y la 4 restantes por la jefatura del proyecto en su condición de Secretario técnico de la MD y N, realizándose además 3 reuniones ampliadas de delegados y 3 plenarias con participación de un universo mayor de mineros artesanales. En el transcurso de la MD y N. las tres cooperativas solicitantes se fusionaron en una Central de Cooperativas (CECOMIRL- Ruc N° 20447645476) quien fue la que concluyó las negociaciones.

La expectativa inicial era suscribir un contrato o acuerdo de explotación que finalmente han devenido en contratos de transferencia de acciones y cesión de acreencias, pero que en definitiva apuntan de manera más sostenible al objetivo fundamental que es la formalización

En las décimo primera y décimo segunda sesiones de la MD y N. se suscribió en Contrato de Intención y se fijaron los términos sustanciales para el acuerdo o acuerdos finales respectivamente y en la parte final de este proceso se ha contado con la intervención de abogados de las partes y consultores especializados, contratados por GAMA; para garantizar la forma y seguridad jurídica de los acuerdos adoptados.

Fue un proceso largo, difícil, con avances y retrocesos; en algunos casos cercanos al fracaso; pero al final primó la voluntad de entendimiento de las partes y se firmaron los respectivos contratos, en presencia del señor Vice Ministro de Minas; el 15 de agosto del 2007 con la satisfacción de encaminarnos responsablemente al logro del objetivo sustancial que es la formalización y con asidero para afrontar nuevos retos.

Posteriormente INDECOPI ha reconocido formalmente a los nuevos acreedores (Central de Cooperativas) y estos como acreedores y accionistas mayoritarios están asumiendo el control de la empresa y en tal condición, su presidente, ha dirigido la primera junta de acreedores, en la nueva gestión de la empresa.

Complementariamente, CECOMIRL ha adquirido la acreencia de Multiexport SA, solicitando su reconocimiento dentro del procedimiento concursal y por lo tanto incrementando su participación en el porcentaje de acreedores.

2.1.2 Gestión de conocimientos y plataforma TIC

Este eje se desarrolló en base a tres líneas de acción: 1.- Desarrollo de Capacidades 2.- Desarrollo de la Plataforma GECO y 3.- Sostenibilidad de Convenios de Telecentrización.

El **desarrollo de capacidades** de mineros/as es fundamental para que estos puedan hacer un uso adecuado de las TIC y así promover el uso de la plataforma de conocimientos y el acceso productivo, allí donde se instale conectividad.

Entre los resultados obtenidos se reporta lo siguiente:

a) *Se ha producido un manual de computación básica e Internet, para ser distribuido entre los mineros artesanales y en los puntos de acceso a Internet.* Este contiene instrucciones para el uso de programas básicos de cómputo tales como Word y Excel y uso de Internet como instrumento de comunicación e información de los mineros artesanales. En los último días del año se ha distribuido en la comunidad minera de San Luis y se continuará haciéndolo en otras localidades donde se han instalado telecentros y Cabinas telecentrizadas así como en las comunidades que estén interesadas en obtenerlo.

b) *Se ha producido un Manual del Uso de la plataforma GECO.* para facilitar el acceso a la plataforma a todas aquellas personas que desean participar ingresando información, así como para apoyar con material impreso para el reforzamiento de las capacitaciones. El manual ya ha sido distribuido en las comunidades con acceso a Internet tales como Rinconada, Cerro Lunar, Santa Filomena, El Ingenio, etc. y se espera que en los primeros meses del 2008 se pueda distribuir a otras zonas, así como a miembros de instituciones ligados a la minería artesanal.

c) *Se ha realizado Capacitaciones en uso de PC y la Plataforma GECO.* Estas capacitaciones fueron realizadas en los telecentros de Santa Filomena y Cerro Lunar. En Santa Filomena, Ayacucho, estuvo orientada para directivos de la Empresa SOTRAMI S.A y se realizó en un periodo de 3 semanas con talleres realizados únicamente los fines de semana; mientras que en Cerro Lunar, Puno, contó como participantes a mineros artesanales y se desarrollo por el periodo aproximado de 5 semanas con talleres realizados tres veces por semana.

d) No sé ha logrado hacer una capacitación constante a miembros de instituciones ligadas a la minería artesanal, Sin embargo, mediante compromisos vinculantes, se ha establecido que los consultores contratados por GAMA directamente o a través de los beneficiarios, inserten sus informes y materiales de capacitación en la plataforma GECO como valor agregado a los productos comprometidos. En este sentido se ha logrado la participación con apoyo y orientación de GAMA de consultores tales como: Red Social, G&R Ingenieros, Percy Ocola, Federico Gamarra y dirigentes gremiales como Manuel Reynoso entre otros.

e) No se ha logrado realizar ninguna presentación pública de la estrategia TIC y la plataforma GECO debido a que el evento programado para el “Jueves Minero” del 16 de Agosto 2007 en el Instituto de ingenieros de minas del Perú, se cancelo por razones de fuerza mayor (el terremoto del 15 de agosto 2007). Este evento será posible concretarlo en el primer trimestre del 2008.

f) *Se ha elaborado el documento “Sistematización de la experiencia de creación y desarrollo del telecentro de Santa Filomena”.*

Durante el ejercicio 2007, se ha realizado un trabajo constante de **desarrollo de la Plataforma GECO**, actualizando la sección de sub proyectos, y agregando documentos relevantes y videos. En cuanto a diseño de la plataforma se ha modificado algunas características, por ejemplo el cambio de lugar de la opción del login de tal forma que sea más accesible a los usuarios, se ha ensayado la colocación de un banner publicitario con el fin de buscar la sostenibilidad económica de la plataforma después del cierre del proyecto a través de la autofinanciación por medio de venta de publicidad, se ha agregado una barra de publicidad del google con el mismo fin, con lo cual hasta el momento no se ha logrado los objetivos esperados.

En cuanto a la promoción del uso de la plataforma se ha buscado que, tanto los telecentros como las cabinas telecentradas, pudieran desarrollar un mejor trabajo en cuánto promoción de la plataforma, uso de la misma y capacitaciones a usuarios. La realización de estas actividades solo han sido puestas en práctica por dos comunidades, una es Cerro Lunar (Puno) en donde los operadores han trabajado con un grupo de mineros y han realizado capacitaciones, la segunda es el centro de Computo de Ingenio (Ica) quienes a pesar de no haber logrado que grupos significativos de mineros o mujeres mineras se capaciten han realizado capacitaciones a pequeños grupos de personas en las que han incluido a algunos mineros.

Por otro lado, se han realizado pruebas de usabilidad de la Plataforma con aquellas personas que se han acercado a GAMA a solicitar apoyo para el ingreso de información de GECO, asimismo, se ha hecho consultas con algunos operadores de telecentros y cabinas (Cerro Lunar y El Ingenio) el problema observado en ambos casos es la dificultad para acceder a la información necesaria, y sobre todo que los documentos estén presentados de manera atractiva para los mineros. Gracias a estas observaciones se reafirmo que las páginas más interesantes para los mineros son: la del “*precio del Oro*” y la sección “*Comunidades Perú*”.

Durante el ejercicio 2007, se buscó también la **Sostenibilidad de los Convenios de Telecentricación**. Esto se realizó de dos maneras:

Se Apoyó en la realización de planes de trabajo para efectuar capacitaciones a mineros artesanales en puntos de acceso que cuentan con convenio con GAMA. Se ha logrado trabajar con los encargados de los puntos de acceso de las comunidades tales como El Ingenio, La Rinconada y Cuatro Horas.

A través del Messenger (medio más eficaz de comunicación con las comunidades) se ha tenido distintas sesiones de coordinación para llevar a cabo estas capacitaciones, en cada una de ellas se ha logrado realizar planes de capacitación, horarios, metodologías, etc. Sin embargo, este trabajo ha quedado estancado debido a un problema principal: la falta de compromiso por parte de los propios mineros para cumplir con las acciones mínimas necesarias para pasar de la coordinación a la acción.

El aumento del precio del oro ha causado un desinterés de todo aquello que no sea extraer oro. En las comunidades de Rinconada y San Luís, se ha retrasado el avance debido a aspectos más técnicos, corte de comunicación en el caso de Rinconada y dificultad para conseguir a un capacitador en el caso de San Luís, en estas dos últimas comunidades se ha retomado la comunicación y las capacitaciones estarían concretándose en los primeros meses del 2008.

Resumen:

Desarrollo de capacidades	Plataforma GECO	Convenios de telecentricación.
<ul style="list-style-type: none"> • Se ha capacitado a aproximadamente 310 mineros/as artesanales • Se han capacitado a 12 operadores de puntos de acceso telecentricado en las comunidades de Cerro Lunar, El Ingenio y Otoa. • Se han capacitado a 16 personas representantes de instituciones, dirigentes mineros, consultores y miembros de ONG. 	<ul style="list-style-type: none"> • Plataforma actualizada en un 85%. en lo referente a subproyectos • Se han realizado pruebas de usabilidad para el mejoramiento de la plataforma GECO efectuando algunas modificaciones como respuesta a esta información. • La plataforma cuenta en la actualidad con 712 usuarios registrados de los cuales 373 se han registrado en el 2007, y se han recibido este periodo 411,010 visitantes distintos en la plataforma GECO, con una media de 34,250 personas mensualmente. • Se ha diseñado, impreso y distribuido el tutorial de uso de la Plataforma GECO. • Se ha diseñado e impreso un Manual de Computación Básica e Internet. • El centro de cómputo municipal de Otoa, los telecentros de Santa Filomena y Cerro Lunar y la cabina de Cuatro Horas. son atendidos por mujeres. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hay acceso a Internet en Tulín, El Ingenio, Otoa, Cuatro Horas, Chaparra, San Luís, Santa Filomena, Mollehuaca, Relave, y La Rinconada y Secocha • Se han firmado 5 convenios de telecentricación con cabinas y/o centros de computo en las comunidades de Tulín, Ingenio, Otoa, Cuatro Horas, y La Rinconada, a las cuales se les esta brindando asesoría técnica y capacitación. • Se ha realizado trabajo de asesoramiento para realización de capacitaciones a 4 cabinas telecentricadas.

2.1.3 Investigación: Empoderamiento como estrategia de lucha contra la pobreza

Durante el 2007 se realizó, la evaluación y análisis del correspondiente estudio hasta concluir con el Informe Final definitivo en el mes de octubre. Está prevista la publicación de un libro en base a la investigación realizada, cuyos costos serán cubiertos en partes iguales por INFORMET y GAMA.

A fecha, INFORMET ha realizado gestiones ante el Fondo Editorial de la Universidad Católica para la publicación y difusión del libro. El documento ya ha sido entregado a dicha entidad para su revisión correspondiente. Se prevé que en el transcurso de los primeros meses del 2008, se publicará el libro y luego se realizarán la presentación pública del mismo y su amplia difusión.

El Informe Final presenta, además del Prólogo y el Resumen Ejecutivo, los siguientes capítulos:

1. Introducción
2. El enfoque de Empoderamiento, referido al protagonismo de los actores para la generación del desarrollo.
3. Contexto de desarrollo de las localidades minero artesanales estudiadas (Mollehuaca, Cuatro Horas, Cháparra, Santa filomena, San Luís, Relave y Ananea).
4. Caracterización de la actividad minera artesanal. Donde se enfatiza el proceso productivo minero y la cadena de intercambios.
5. Desarrollo de los medios esenciales para el empoderamiento. Es decir, acceso a información, inclusión y participación, responsabilidad y rendición de cuentas, fortalecimiento organizativo local y conclusiones al respecto.
6. Empoderamiento como proceso de desarrollo de capitales y capacidad de agencia o autogestión. Utilizando el enfoque de medios de vida sostenibles.
7. Aproximación a la tipología del empoderamiento desde el caso de las comunidades minero artesanales. Se analizó los estadios en el proceso de empoderamiento, la relación de éste con el desarrollo de capitales y la comprobación de hipótesis.

La realización de la investigación ha permitido experimentar herramientas innovadoras para la investigación, desarrollo y sistematizar las experiencias de implementación de la estrategia de empoderamiento del Proyecto GAMA sin pretender atribuir exclusivamente a éste los avances sino a los esfuerzos de la propia población minero artesanal para salir de la pobreza. Se ha dedicado bastante tiempo a determinar indicadores y variables adecuados para medir empoderamiento sin que otras variables distorsionen los resultados como podría hacerlo el incremento del precio del oro en más del 100%.

Con el objeto de establecer una tipología de empoderamiento para el caso de comunidades mineros artesanales, se ha elaborado un perfil de las características de las comunidades estudiadas y se ha ubicado ese perfil en el contexto de un proceso de desarrollo social toda vez que el empoderamiento sólo es posible mediante el desarrollo de capacidades personales, organizativas e institucionales. Como resultado se tiene una propuesta de tres estadios o etapas de desarrollo del empoderamiento: (1) Emergente, (2) Funcional y (3) Pleno. La sucesión de etapas depende del incremento de activos y capacidades de los actores. Para cada estadio han sido precisadas sus variables y características según capitales.

Esta herramienta de análisis válida y confiable ha sido aplicada a cada una de las comunidades investigadas, obteniéndose que:

- Existen localidades que han alcanzado estadios plenos pero a nivel global, el desarrollo del empoderamiento es mayormente funcional.
- Las organizaciones minero artesanales son los principales actores de desarrollo en sus localidades.



- Los sectores pobres ha adquirido la capacidad de tomar decisiones para ayudarse a si mismos de una forma participativa y responsable, impulsando en forma autosostenida y responsable su bienestar. Esta forma de empoderamiento se manifiesta principalmente a nivel social y humano y no en los niveles económico o físico.

En lo que se refiere a la comprobación de hipótesis, luego de definir conceptualmente el proceso de producción primaria de la minería artesanal en los modelos económicos de Medios de Vida (MV) y Factores de Producción (FP), se obtuvo que:

- Para el análisis de la primera sub-hipótesis cuyo enunciado es *“A mayor empoderamiento, menor vulnerabilidad y mayor control sobre los medios de vida”*, se tiene que el nivel de empoderamiento en las localidades mineras artesanales muestra una relación directa con el nivel de control sobre los recursos. Así se comprobaría que las comunidades que han desarrollado mayor empoderamiento tienen menor vulnerabilidad y mayor control sobre su vida, además cabe señalar que el empoderamiento “para y desde” conduciría inclusive a un empoderamiento “sobre” e el sentido que los mineros aprenden como lograr control sobre el recurso mineral (mediante concesiones y acuerdos de palabra), lo que los hace menos vulnerables. En consecuencia, se verifica la sub-hipótesis *“A mayor empoderamiento, mayor control sobre los recursos y en consecuencia menor vulnerabilidad”*

- la segunda sub-hipótesis señala *“A menor vulnerabilidad y mayor control sobre los medios de vida, menor pobreza”*. En las comunidades investigadas no se aprecia relación entre empoderamiento y reducción de la pobreza ya que las localidades que poseen un mayor nivel de empoderamiento, presentan niveles de reducción de la pobreza similares a los alcanzados por las comunidades con nivel de empoderamiento menor.

-

Si bien en la primera sub-hipótesis la menor vulnerabilidad era consecuencia de del mayor control sobre los medios de vida a nivel colectivo pero siendo que la pobreza se mide a nivel individual, se producirán nuevos desequilibrios entre aquellos que saben aprovechar el empoderamiento y los que se quedan al margen.

En consecuencia, la segunda hipótesis ha sido parcialmente descartada, siendo su nueva formulación: *“A menor vulnerabilidad y mayor control sobre medios de vida, menor pobreza pero entre aquellos que saben aprovechar las nuevas oportunidades y no necesariamente en forma automática y general ocurriría menor pobreza en toda la comunidad”*.

- Sobre la hipótesis de trabajo: *“Frente a una situación de vulnerabilidad, los mineros artesanales han desarrollado su capacidad de agencia mediante la alimentación y combinación de los capitales con los que cuentan. El uso de esta capacidad les ha permitido convertirse en individuos empoderados, con ello reducir sus niveles de pobreza”*.

Las sub-hipótesis han demostrado que un proceso de empoderamiento aunque actúa sobre lo colectivo, es asimilado en forma diferenciada por los individuos, y no necesariamente logra promover la reducción de la pobreza en un sentido colectivo. La pobreza está asociada con muchos factores entre ellos los de naturaleza individual que siguen siendo invisibles.

Ante la pregunta ¿contribuye el empoderamiento a la reducción de la pobreza?, podemos responder que sí pero según el aprovechamiento que los individuos hagan de sus recursos, según la pertinencia de sus decisiones.

Consecuentemente, la hipótesis de trabajo ha sido reformulada en los siguientes términos: *“Frente a una situación de vulnerabilidad, los mineros artesanales ha*

desarrollado su capacidad e agencia mediante la alimentación y combinación efectiva de los capitales con los que cuentan. El uso de esa capacidad a permitido a los individuos empoderados reducir sus niveles de pobreza, y/o la conciencia de su situación de pobreza es el principal motor que conduce y motiva a los mineros a empoderarse.

2.1.4 Plan de acción dirigido a lograr la recuperación de la cuenca del río Ramis-Puno

Mediante Resolución Ministerial N° 374-2006-PCM del 22-10-2006 se constituyo una *“Comisión multisectorial encargada de proponer un Plan de acción dirigido a lograr la recuperación de la cuenca del río Ramis”* Dicho plan fue aprobado por Decreto Supremo N° 034-2007-EM. del 04-07-2007.

Posteriormente, el 05-07-2007 mediante Resolución Ministerial N° 192-2007-PCM. se creo la comisión encargada de coordinar y efectuar el seguimiento de las acciones a corto y mediano plazo contempladas en el precitado plan que en el numeral 4.1.4 se considera la suscripción de un *“convenio de apoyo interinstitucional entre el Gobierno Regional y el Proyecto Gestión Ambiental en la Minería Artesanal (GAMA)-COSUDE con el objetivo de desarrollar un plan de capacitación para la minería artesanal y la pequeña minería de la zona en temas de salud minera, legislación minera, legislación ambiental, género, procesos de formalización transformación y comercialización, minería y desarrollo sostenible.....y otros”*

En concordancia con lo expuesto, la jefatura del Proyecto GAMA fue invitada a participar en la instalación y primera reunión de trabajo de la precitada comisión, el día 16 de julio del 2007, en la cual se trato entre otros aspectos el Convenio de de apoyo interinstitucional entre el Gobierno Regional de Puno y el Proyecto GAMA. Como resultado de uno de los acuerdos adoptados se suscribió al día siguiente (17-Julio-2007) el Contrato de mandato con gestión de fondos entre la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente y la DREM-Puno; en representación del Gobierno Regional de Puno y el Proyecto GAMA. El monto puesto a disposición del Gobierno Regional de Puno, a título fiduciario es el equivalente US\$. 15,000.00, que corresponde al límite máximo de decisión de la jefatura del proyecto GAMA.

En la implementación del acuerdo GAMA contribuyo con la formulación de los términos de referencia para la contratación de los respectivos capacitadores, habiendo correspondido la convocatoria y selección de los mismos, al Gobierno Regional de Puno .A la fecha ya se efectuó el primer desembolso para el desarrollo del subproyecto ejecutado bajo la modalidad de acción propia a través de nuestra contraparte regional.

2.2 Subproyectos

Durante el año del 2007, se han recepcionado **23** propuestas, de las cuales **11** han devenido en subproyectos **5** se han derivado a otra modalidad de atención o han sido archivadas y las restantes **7** continúan como propuestas a la espera de cumplir ciertos requisitos indispensables para continuar su trámite. Los expedientes y evolución de todas las solicitudes o propuestas se encuentran documentados en el “Monitor de subproyectos” (www.gama-peru.org/monitor)

La distribución de las propuestas recibidas y de los subproyectos ejecutados, en curso o por iniciarse, así como la modalidad de ejecución de los subproyectos se expresan en los gráficos considerados como **anexo N°3**



DETALLE DE SUB-PROYECTOS GAMA 2007

REGION	CENTRO MINERO	SUB-PROYECTO	CONTRATO	MONTO		EJECUTADO	SALDO	OBSERVACIONES	BENEFICIARIOS
				t.c.	3.00				
				USD	USD	USD			
AREQUIPA	Misky	Retorta Comunal	C-2007.13	8,147	7,561			Concluido	2,000 (1)
	Cerro Rico - Base Rey	Capacitación, Organización y gestión Empresarial	C-2007.23	15,887	13,537	-		Concluido	150 (2)
	Cerro Rico - Base Central	Ampliación de la retorta Comunal y asistencia Técnica	C-2007.31-32	3,515	3,087			Concluido	1,500 (3)
	Choco	Capacitación Empresarial	C-2007.36	1,200	1,206			Concluido	1000 (4)
	San Cristobal	Taller de capacitación. Fortalecimiento institucional, seguridad e Higiene Minera y otros	C-2007.38	1,200	1,138			Concluido	300 (5)
AYACUCHO	Sotrami	Fortalecimiento de capacidades de gestión	C-2006.38	3,500	3,289			Concluido	150 (6)
	Relave	Ases. Técnica y levantamiento topográfico en concesiones de AURELSA	C-2007.39	8,067	8,069			Concluido	180 (7)
	Minera Ballón	Capacitación en gestión emp. Tecnología minero ambiental, comercialización y costos.	C-2007.40	12,570	3,770	8,800.26		En ejecución	100 (8)
PUNO	Girigachi	Asesoramiento y capacitación	C-2006.36	7,165	5,118			Concluido	800 (9)
	Rinconada	MD y N		5,000	5,004			Concluido	20,000 (10)
	Ananea	Capacitación para la minería artesanal y peq. Minería.	C-2007.33	15,000	5,407	9,592.52		En ejecución	2000 (11)
GREMIALES	Red-Social	Organización regional de Asoc de mujeres mineras	C-2007.15	2,596	2,129			Concluido	8 Org MMA
	Fenamrpe	Periodico Minero 3ra Etapa	C-2006.13a	223	125			Concluido	Difusión
		I Congreso Ordinario y II Congreso Estutario	C-2007.21	2,127	1,659			Concluido	180 (Evento)
TOTAL SUBPROYECTOS				86,196	61,099	18,393			
TOTAL MICROACCIONES (12)						2,288			
TOTAL SUB-PROYECTOS						63,387			

- (1) Trabajadores mineros y toda la población de la comunidad
- (2) Solamente Trabajadores mineros
- (3) Trabajadores mineros y toda la población de la comunidad
- (4) Mineros y Colectividad
- (5) Mineros y Colectividad
- (6) Socios de SOTRAMI
- (7) Socios de AURELSA
- (8) Socios de Minera Ballón
- (9) Mineros distintas Localidades
- (10) Trabajadores mineros y toda la población de la comunidad
- (11) Mineros y toda la comunidad
- (12) C-2007.01, C-2007.19, C-2007.22, C-2007.29

Respecto a ejecución de los subproyectos, formulamos los siguientes comentarios:

- La ejecución y puesta en marcha de “Retortas Comunes” ha significado la validación de una tecnología, que se considera como tecnología limpia: y que esta mereciendo la acogida de los usuarios mineros, porque de manera tangible y cuantificable es posible demostrar sus bondades tanto ambientales (evita efectos dañinos al ambiente y la salud de los operadores) como económicas, por cuanto la recuperación del mercurio permite reutilizado, con la consiguiente reducción de sus costos

- La capacitación ambiental-técnico, ha posibilitado otorgar los conocimientos básicos en aspectos de Técnica minera, Beneficio, Gestión ambiental y Seguridad e Higiene Minera, adecuados a las características de la Minería artesanal., con lo cual vienen mejorando su productividad.

- En cuanto al fortalecimiento de capacidades de gestión, como resultado de los subproyectos de capacitación en este rubro; también se han logrado resultados satisfactorios y que guardan correlación entre capacitación y desarrollo empresarial y organizacional.

- En el aspecto género, si bien es cierto, con la ejecución del subproyecto de “Fortalecimiento y apoyo a la formación de organizaciones de mujeres mineras artesanales en el Sur Medio” se ha avanzado en la legalización de 8 organizaciones nuevas y el reforzamiento de 2 existentes, todas inscritas en Registros Públicos y por lo tanto con personería jurídica; aún no se ha avanzado significativamente hacia el objetivo

sustantivo de *“Reforzar la visibilización de los aportes de las mujeres en las comunidades mineras y posibilitar el ejercicio de sus derechos y acceso a oportunidades.”*

2.3 Microacciones

Las “micro acciones”, son en principio subproyectos, con solicitud de aportes debajo de USD 1,000, de corta duración y con la finalidad del apoyo inmediato. Entre las más importantes ejecutadas durante el año 2007, figuran las siguientes:

- Monitoreo de operaciones de retortas comunales de Chaparra, Chala, Mollehuaca, Relave y Tulin
- Alquiler de equipos para levantamiento topográfico. de labores mineras, campamentos de centros minero artesanales de Mollehuaca, y Relave en apoyo complementario a labor de extensión social de la PUCP
- Apoyo en la organización de evento relacionado con “Comercio Justo y estándar cero para oro artesanal”
- Apoyo a Gerencia de RR.NN y Medio Ambiente del GRP. Para realización de “I foro para la preservación del lago Titicaca”-

Mayor detalle, de otras actividades realizadas en el semestre se reporta en el (**anexo 4**)

2.4 Acciones complementarias en prevención de desastres

El Jefe de Proyecto y el Encargado de Servicios Generales de GAMA forman parte del equipo de intervención de COSUDE en casos de desastres.

El proyecto presto apoyo al Programa de Ayuda Humanitaria y Gestión de riesgos, con intervención del señor Oscar Fernandez para el caso de friaje en Puno y con movilidad y personal (O.Fernandez) para el caso del terremoto de Ica y provincias aledañas.

3. Comparación con matriz de objetivos propuestos en el POA 2006

(Ver **anexo 2**)

- En cuanto a la **Línea de acción Ambiental-Técnico**: los resultados obtenidos guardan relación con lo esperado en el año y se espera una similar tendencia con respecto a la Fase 3 que se explican con lo expuesto en la columna de “avances y resultados del 2007”.

- En relación a la **Línea de Acción Socio –Económico**, Los resultados referentes al proceso de formalización en La Rinconada y aledaños y la Mesa de Diálogo y Negociación vinculada a este proceso son de gran trascendencia y constituyen una buena experiencia para afrontar, con algunas variables estratégicas; adecuadas a cada realidad procesos similares. En lo que respecta a la cantidad de títulos obtenidos se viene superando la meta prevista en razón de que las buenas y persistentes condiciones del mercado internacional de los metales; condicionan la necesidad de obtener seguridad jurídica para sustentar sus actividades productivas.

- Respecto a la **Línea de acción Socio Organizativo**, los resultados alcanzados son relativos, por un lado en el aspecto organizativo, tanto a nivel general como en lo referente a organizaciones de mujeres; se viene incrementando y las metas previstas estarían superadas ,pero si se toma en cuenta la permanente incorporación de más personas a la actividad minero artesanal motivadas por el desempleo o por la actual



coyuntura espectacularmente favorable de precios de los metales, particularmente Oro se tiene la impresión de que no hay avances en el proceso de formalización.

En lo que se refiere al programa de telecentros, Tecnologías de información y comunicación (TIC) y plataforma de conocimientos, se ha adoptado un cambio estratégico en el sentido de utilizar complementariamente a las cabinas de Internet instaladas, por iniciativa particular, como instrumentos para viabilizar los objetivos previstos por el proyecto que en síntesis son 1.-Desarrollo de Capacidades 2.- Desarrollo de la Plataforma GECO y que conducen a lo que se ha dado en llamar telecentralización,

4. Resumen Financiero

INFORME FINANCIERO GAMA AL 31.12.2007

DISPONIBLE AL 01.01.2007

Bancos y Caja		18,519
Cuentas por cobrar		3,748
Cuentas por pagar		-17,295
TOTAL		4,971

INGRESOS 2007

Transferencias PC		285,000
TOTAL		285,000

EGRESOS	1.25		1.25		% USD	% USD
	POF USD	POF CHF	EJECUTADO USD	EJECUTADO CHF		
Presupuesto del Servicio						
COSTOS DIRECTOS internacional						
COSTOS directos (personal)						
Viajes internacionales (residentes y familia)						
Pasajes internacionales (asesor residente y familia)	3,504	4,380	-	-	0%	0%
Mudanza al fin de periodo residente	-	-	-	-		
Vuelos anuales a pais de origen	4,032	5,040	-	-		
Subtotal	7,536	9,420	-	-		
Costos de estadia de personal residente						
Vivienda	26,200	32,750	-	-	0%	0%
Educación de hijo	-	-	-	-		
Subtotal	26,200	32,750	-	-		
Presupuesto Fondos Fiduciarios						
COSTOS DEL PROYECTO						
Remuneración personal local						
Personal del proyecto						
Jefe Nacional del Proyecto						
Gerenta de operaciones	144,415	180,519	47,388	59,234	33%	33%
Secretaria	107,241	134,051	34,741	43,426	32%	32%
Contadora (tiempo parcial)	46,123	57,654	15,685	19,606	34%	34%
Servicios Generales	5,330	6,663	66	82	1%	1%
Limpieza y jardin	47,256	59,070	15,725	19,656	33%	33%
Subtotal	12,762	15,953	4,177	5,221	33%	33%
Consultores nacionales o regionales (andinos)	363,127	453,909	117,780	147,225		
Expertos						
Subtotal	19,874	24,843	7,534	9,417	38%	38%
COSTOS DIRECTOS (nacional/regional-andino)	19,874	24,843	7,534	9,417		
Viajes						
Pasajes nacional/regional-andino	8,871	11,089	3,145	3,931	35%	35%
Viaticos y gastos viaje consultores	519	649	460	575	89%	89%
Viaticos y gastos viaje de personal del proyecto	21,392	26,740	7,174	8,967	34%	34%
Subtotal	30,782	38,478	10,779	13,473		
Infraestructura local						
Oficina: alquiler	17,574	21,968	7,576	9,471	43%	43%
Oficina: gastos de operación	11,826	14,783	4,892	6,115	41%	41%
Oficina: materiales	4,288	5,360	1,791	2,239	42%	42%
Oficina: mantenimiento y reparación equipos	5,928	7,410	2,117	2,646	36%	36%
Vehiculo: gastos de operación	20,356	25,445	6,355	7,944	31%	31%
Subtotal	59,972	74,965	22,732	28,415		
Compra de equipos						
Adquisición de equipos de oficina	79	99	79	99	101%	101%
Subtotal	79	99	79	99		
Terceros						
Auditoría local	13,680	17,100	5,500	6,875	40%	40%
Subtotal	13,680	17,100	5,500	6,875		
OTROS FONDOS FIDUCIARIOS						
Otros fondos fiduciarios						
Adquisición de material de proyecto	1,176	1,470	-	-	0%	0%
Talleres, eventos, seminarios, reuniones, etc.	12,000	15,000	3,282	4,102	27%	27%
Gestión de conocimiento (plataforma TIC)	80,846	101,058	32,028	40,035	40%	40%
Publicación e diseminación	18,825	23,531	3,674	4,593	20%	20%
Subproyectos	196,109	245,136	62,188	77,735	32%	32%
Fortalecimiento Gobiernos Regionales	19,242	24,053	5,902	7,378	31%	31%
Subtotal	328,198	410,248	107,074	133,843		
Ingresos						
Eventual venta de inventario al cierre del proyecto	(24,528)	(30,660)	-	-		
Otros ingresos (*)	-	-	(8,064)	(10,080)	33%	33%
Subtotal	(24,528)	(30,660)	(8,064)	(10,080)		
TOTAL	824,920	1,031,150	263,414	329,268	32%	32%
Gastos administrativos Projekt Consult	-	-	-	-		
TOTAL	824,920	1,031,150	263,414	329,268	32%	32%
IGV por cobrar 2007						
				15,281		

DISPONIBLE AL 31.12.2007

Bancos y Caja		26,864
Cuentas por cobrar		5,487
Cuentas por cobrar igv		-
Cuentas por pagar		-10,740
TOTAL		21,612

RESUMEN

DISPONIBLE AL 01.01.2007		4,971
INGRESOS 2007		285,000
IGV POR COBRAR PERIODO 2006		9,994
IGV POR COBRAR PERIODO 2007	(-)	15,281
DIFERENCIA CAMBIO 2007	(-)	-342
EGRESOS	(-)	263,414
PROJEKT CONSULT	(-)	-
DISPONIBLE AL 31.12.2007	(-)	21,612
(*)		0

ingreso dinero : maestría y alquiler ofc USD 1,156.00
 reversión de gastos fase 2003-2005 Informet USD 5,324.97
 igv por recuperar del año 2007 factura Informet USD 1,582.72

GASTOS PERIODOS 2006 - 2007 GAMA USD

EGRESOS		GASTOS		%
Presupuesto del Servicio	POF	2006	2007	USD
COSTOS DIRECTOS internacional	USD	USD	USD	USD
COSTOS directos (personal)				
Viajes internacionales (residentes y familia)				
Pasajes internacionales (asesor residente y familia)	3,504	3,504	-	100%
Mudanza al fin de periodo residente	-	384	-	0%
Vuelos anuales a país de origen	4,032	3,648	-	90%
Subtotal	7,536	7,536	-	
Costos de estadia de personal residente				
Vivienda	26,200	26,200	-	100%
Educación de hijo	-	-	-	
Subtotal	26,200	26,200	-	
Presupuesto Fondos Fiduciarios				
COSTOS DEL PROYECTO				
Remuneración personal local				
Personal del proyecto				
Jefe Nacional del Proyecto	144,415	46,104	47,388	65%
Gerenta de operaciones	107,241	35,907	34,741	66%
Secretaria	46,123	14,572	15,685	66%
Contadora (tiempo parcial)	5,330	5,264	66	100%
Servicios Generales	47,256	15,596	15,725	66%
Limpieza y jardin	12,762	4,319	4,177	67%
Subtotal	363,127	121,763	117,780	
Consultores nacionales o regionales (andinos)				
Expertos	19,874	12,340	7,534	100%
Subtotal	19,874	12,340	7,534	
COSTOS DIRECTOS (nacional/regional-andino)				
Viajes				
Pasajes nacional/regional-andino	8,871	3,326	3,145	73%
Viativos y gastos viaje consultores	519	59	460	100%
Viativos y gastos viaje de personal del proyecto	21,392	7,718	7,174	70%
Subtotal	30,782	11,103	10,779	
Infraestructura local				
Oficina: alquiler	17,574	3,998	7,576	66%
Oficina: gastos de operación	11,826	3,934	4,892	75%
Oficina: materiales	4,288	997	1,791	65%
Oficina: mantenimiento y reparación equipos	5,928	2,811	2,117	83%
Vehiculo: gastos de operación	20,356	9,201	6,355	76%
Subtotal	59,972	20,942	22,732	
Compra de equipos				
Adquisición de equipos de oficina	79	-	79	101%
Subtotal	79	-	79	
Terceros				
Auditoría local	13,680	-	5,500	40%
Subtotal	13,680	-	5,500	
OTROS FONDOS FIDUCIARIOS				
Otros fondos fiduciarios				
Adquisición de material de proyecto	1,176	1,176	-	100%
Talleres, eventos, seminarios, reuniones, etc.	12,000	5,035	3,282	69%
Gestión de conocimiento (plataforma TIC)	80,846	19,939	32,028	64%
Publicación e diseminación	18,825	2,151	3,674	31%
Subproyectos	196,109	69,921	62,188	67%
Fortalecimiento Gobiernos Regionales	19,242	8,339	5,902	74%
Subtotal	328,198	106,563	107,074	
Ingresos				
Eventual venta de inventario al cierre del proyecto	(24,528)	(13,000)	-	
Otros ingresos	-	(3,501)	(8,064)	
Subtotal	(24,528)	(16,501)	(8,064)	100%
TOTAL	824,920	289,944	263,414	67%
Gastos administrativos Projekt Consult		3,023		
TOTAL	824,920	292,967	263,414	67%

GASTOS PERIODO 2006 - 2007 GAMA CHF

EGRESOS		1.25	GASTOS		
Presupuesto del Servicio		POF	2006	2007	%
COSTOS DIRECTOS internacional		CHF	CHF	CHF	CHF
COSTOS directos (personal)					
Viajes internacionales (residentes y familia)					
Pasajes internacionales (asesor residente y familia)	4,380		4,555	-	104%
Mudanza al fin de periodo residente	-		499	-	0%
Vuelos anuales a país de origen	5,040		4,742	-	94%
Subtotal	9,420		9,796	-	
Costos de estadía de personal residente					
Vivienda	32,750		34,060	-	104%
Educación de hijo	-		-	-	
Subtotal	32,750		34,060	-	
Presupuesto Fondos Fiduciarios					
COSTOS DEL PROYECTO					
Remuneración personal local					
Personal del proyecto					
Jefe Nacional del Proyecto	180,519		59,935	59,234	66%
Gerenta de operaciones	134,051		46,679	43,426	67%
Secretaria	57,654		18,944	19,606	67%
Contadora (tiempo parcial)	6,663		6,843	82	104%
Servicios Generales	59,070		20,275	19,656	68%
Limpieza y jardín	15,953		5,615	5,221	68%
Subtotal	453,909		158,292	147,225	
Consultores nacionales o regionales (andinos)					
Expertos	24,843		16,042	9,417	102%
Subtotal	24,843		16,042	9,417	
COSTOS DIRECTOS (nacional/regional-andino)					
Viajes					
Pasajes nacional/regional-andino	11,089		4,324	3,931	74%
Viaticos y gastos viaje consultores	649		76	575	100%
Viaticos y gastos viaje de personal del proyecto	26,740		10,034	8,967	71%
Subtotal	38,478		14,434	13,473	
Infraestructura local					
Oficina: alquiler	21,968		5,198	9,471	67%
Oficina: gastos de operación	14,783		5,114	6,115	76%
Oficina: materiales	5,360		1,297	2,239	66%
Oficina: mantenimiento y reparación equipos	7,410		3,654	2,646	85%
Vehículo: gastos de operación	25,445		11,962	7,944	78%
Subtotal	74,965		27,224	28,415	
Compra de equipos					
Adquisición de equipos de oficina	99		-	99	101%
Subtotal	99		-	99	
Terceros					
Auditoría local	17,100		-	6,875	40%
Subtotal	17,100		-	6,875	
OTROS FONDOS FIDUCIARIOS					
Otros fondos fiduciarios					
Adquisición de material de proyecto	1,470		1,529	-	104%
Talleres, eventos, seminarios, reuniones, etc.	15,000		6,545	4,102	71%
Gestión de conocimiento (plataforma TIC)	101,058		25,921	40,035	65%
Publicación e disseminación	23,531		2,797	4,593	31%
Subproyectos	245,136		90,898	77,735	69%
Fortalecimiento Gobiernos Regionales	24,053		10,841	7,378	76%
Subtotal	410,248		138,531	133,843	
Ingresos					
Eventual venta de inventario al cierre del proyecto	(30,660)		(16,900)	-	
Otros ingresos	-		(4,552)	(10,080)	
Subtotal	(30,660)		(21,452)	(10,080)	103%
TOTAL	1,031,150		376,928	329,268	68%
Gastos administrativos Projekt Consult			0		
TOTAL	1,031,150		376,928	329,268	68%

4.1 Aporte Suizo para 2007

La tabla expuesta refleja información financiera preliminar, todavía no auditada, y por lo tanto solamente con carácter informativo y aproximado. La cuantificación definitiva del aporte Suizo en el año 2007 se realizará en un informe aparte, es decir, en el informe financiero auditado.

4.2 Aporte Peruano para 2007

A criterio del Jefe de proyecto, el aporte nacional durante el año 2007 ha sido insuficiente, incluso en los aportes en especie salvo los casos de Arequipa y Puno. Esta situación no ha podido ser superada a lo largo de toda la vigencia del Proyecto, salvo en la primera fase cuando en el ministerio de Energía y Minas existían proyectos (MAPEM Y luego PEMIN), que fueron contrapartes de GAMA y que contaban con presupuesto específico para acciones vinculadas a la minería artesanal.

5. Lecciones aprendidas.

La experiencia del caso "Telecentro de Santa Filomena" confirma, que la función de GAMA debe ser apoyar, con asesoría comercial y técnica, (cuando corresponda) a que las propias comunidades, cooperativas o empresas implementen este servicio en vez de montarlos y luego esperar a que la comunidad los tome como propios.

La idea del uso participativo de la plataforma GECO, (intercambio de comunicación horizontal entre comunidades minero artesanales) es una situación que requiere todavía un proceso de maduración y por lo tanto es válida la estrategia de priorizar el desarrollo de capacidades de los potenciales usuarios, para el acceso correcto y eficaz a la plataforma y aprovechar la información que en ella se consigna por parte de GAMA y de algunos consultores y expertos.

Reconocimiento generalizado de la importancia de la organización y participación local para mejorar la calidad de vida.

En las organizaciones mineras se ha observado eficiencia en el manejo de información relacionada con el mercado y la producción mientras que la información relativa a derechos, deberes y medio ambiente es más limitada y esta limitación es aún mayor saliendo del círculo de los dirigentes

No basta la legalización de las organizaciones de mujeres mineras artesanales para otorgarle mayor participación en el quehacer y decisiones de sus comunidades, es necesario incrementar la sensibilización tanto a hombres como a las propias mujeres para reconocer sus derechos, su acceso a oportunidades.

6.- Recomendaciones.

Persistir en la exigencia del requisito adicional; para que en el financiamiento de subproyectos se planteen intervenciones con enfoque integral de Género y el involucramiento de beneficiarios y consultores en el proceso de implementación de la plataforma de conocimientos y TICs.

Priorizar en este último año de la fase, los aspectos de género, sistematización de conocimientos y publicación de los temas más relevantes y la adopción de medidas y acciones que posibiliten la sostenibilidad de los avances logrados con el apoyo de la cooperación Suiza a través de GAMA y tratar de lograr un mayor compromiso de los gobiernos regionales y del MEM con el sector de la minería artesanal/informal.

Versión final 03-04-2008

ANEXOS

Anexo 1: Datos Generales del proyecto

Título del proyecto	Gestión Ambiental en la Minería Artesanal (GAMA)
Contrato	N° 7F-00032.04.01 – Vertrag Nr. 81006309
Contrapartes	COSUDE–Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación Gobierno Regional Ica Gobierno Regional Ayacucho Gobierno Regional Arequipa Gobierno Regional Puno MEM – Ministerio de Energía y Minas
Implementación:	Projekt-Consult GmbH (por mandato de COSUDE)
Duración de la fase	1.1.2006 – 31.12.2008 (3 años)
Personal del proyecto	durante 2007



Nombre	Cargo	Financiamiento	Asignación de tiempo
Personal operativo			
Guillermo Medina	Jefe de Proyecto	COSUDE - GAMA	tiempo completo GAMA
Victoria Nuñez	Gerenta de operaciones	COSUDE – GAMA	tiempo completo GAMA
Felix Hruschka	Asesor	COSUDE - GAMA	tiempo parcial GAMA
Representantes de Contrapartes operativas			
Rocio Gómez	Gerente de RR.NN.	Gobierno Regional Puno	n/a
Anibal Díaz	Gerente de Autoridad Ambiental	Gobierno Regional Arequipa	n/a
Beker Barrientos	Gerente de RR.NN	Gobierno Regional Ayacucho	n/a
Alejandro Arones	Director DREM	Gobierno Regional Ica	n/a
Personal administrativo			
María Eugenia Calderón	Resp. Área Secretarial	COSUDE – GAMA	60% Gama 40% Aguasan
Oscar Fernández	Resp. Área Servicios generales	COSUDE – GAMA	tiempo completo GAMA
Magaly Canales	Resp. Área Administrativo Financiero	COSUDE – AGUASAN	50% Gama 50% Aguasan

Dirección de oficina del proyecto:

Los Halcones 277, San Isidro
Lima, Perú

Tel: (0051 1) 441 56 16

Fax: (0051 1) 441 56 20

Email: gama@gama-peru.org

Página Web: <http://www.gama-peru.org>



Anexo 2 :

LINEA DE ACCION 1 AMBIENTAL – TECNICO							
OBJETIVO	AÑO 2007		POF 3	Avances y resultados 2007	Resultados		
	Resultados	Indicadores			POA 2007		POF %Fase 3
					Nº	%	
Adaptar y difundir sistemas de trabajo y tecnologías limpias y eficientes en la minería artesanal, mejorando las condiciones de trabajo y salud de los mineros artesanales y de la población involucrada.	Propuestas validadas de GAMA, sobre sistemas de trabajo y tecnologías limpias están documentadas	5 Recomendaciones técnicas para 3 formas de contaminación (Hg, sólidos en suspensión y Cianuro)	10	-Para el Mercurio: "Retortas comunales" en Misky y C° Rico-Central. -Sólidos en suspensión cuenca del Ramis	3	60	60
		Reducción de emisiones de mercurio en 1TM/año	3 TM.	Gradual incremento operativo de 14 retortas comunales, posibilitan reducción de emisiones de Hg. en el I orden de los 1,000 Kg/año	1,000	100	66
	Mineros artesanales implementan, cada vez más; con aporte propio propuestas de GAMA.	Uso de tecnologías mejoradas en 10 comunidades minero artesanales	20	En los asentamientos mineros de C° Rico-Base Central (Arequipa) y Relave (3) (Ayacucho), Choco y San Cristóbal (Arequipa) y La Rinconada Puno) se ha capacitado en aplicación de tecnologías mejoradas y limpias.	8	80	70
		Cambios tecnológicos con inversión propia en 2 comunidad minero artesanal.	5	En el asentamiento minero de Relave (Ayacucho) se esta empleando perforación neumática con compresoras estacionarias y tienen EIA, aprobado para su planta de beneficio, con inversión propia.	1	50	60

LINEA DE ACCION 2 SOCIO ECONÓMICO							
OBJETIVO	AÑO 2007		POF 3	Avances y resultados 2007	Resultados		
	Resultados	Indicadores			POA 2007		POF %Fase 3
					Nº	%	
Capacitar a los mineros artesanales para que puedan formalizarse.	Se ha resuelto conflicto y suscrito contrato en La Rinconada, Cerro lunar y aledaños en Puno y en otras comunidades minero artesanales del área de influencia de GAMA sistematizando y difundiendo experiencia	Suscripción del contrato de explotación en La Rinconada-Puno.	1	Se suscribió Acuerdo de transferencia de % mayoritario de acciones y cesión de acreencias a favor de central de cooperativas CECOMRIL, quienes asumen control de empresa.	1	100	100
		3 contratos de explotación en proceso y 3 suscritos	8	Hay 2 contratos de explotación suscritos,3 en proceso y unos 10 de acercamiento al diálogo	2	33	50
		15 títulos obtenidos por mineros artesanales	50	Hay . 80 PMA que son resultado de superar la informalidad y un número mayor por adecuación a escala y beneficios extensivos de la Ley de formalización facilitada por GAMA.	Meta superada 40	Meta superada (2) 266	Meta superada 160
	Proceso de formalización continua Empresas existentes mejoran sus operaciones y se constituyen nuevas empresas	Gestión empresarial más eficiente en 4 operaciones minero artesanales	10	AURELSA en Relave (Ayacucho) ,CECOMRIL (Puno) Cerro Rico bases Central y Rey acusan una gestión empresarial, progresivamente más eficiente.	4	100	70

LINEA DE ACCION 3 SOCIO ORGANIZATIVO							
OBJETIVO	AÑO 2007		POF 3	Avances y resultados 2007	Resultados		
	Resultados	Indicadores			POA 2007		POF% Fase 3
					Nº	%	
Fortalecer y promover a nivel local, regional y nacional instituciones, organizaciones comunitarias y productivas en capacidad de gestión ambiental.	El sub-sector de la minería artesanal ha progresado en la consolidación de su nivel organizacional.	Se han consolidado en su nivel organizacional hasta un 50% de las organizaciones minero artesanales existentes	90%	Existe más de una centena de organizaciones minero artesanales entre asociaciones y empresas minero artesanales .La referencia porcentual se aplica con respecto las organizaciones que se van gestando durante la vigencia del Proyecto	Meta supe rada	Meta supe rada (1) 60	Meta Alcanzada 90
	El nivel de participación de las mujeres en las organizaciones ha incrementado.	Existen unas 8 organizaciones de mujeres mineras artesanales funcionando y en proceso de coordinación en red.	20	10 organizaciones de mujeres miera artesanales están en proceso de legalización de las cuales 4 ya disponene3 de su inscripción en los Registros Públicos.	10	125	60
	La plataforma TIC del proyecto es conocida entre los mineros artesanales y contribuye progresivamente para su capacitación y comunicación.	4 cluster de comunidades minero artesanales del área de influencia de GAMA, cuentan con telecentros y acceden a plataforma TIC.	8	Hay acceso a Internet en Tulin, El Ingenio (Ica) Otoa, San Luis, Santa Filomena y Relave (Ayacucho), Mollehuaca, Cuatro Horas y Chaparra (Arequipa), y La Rinconada. Y Cerro Lunar (Puno).	4	100	75
		Al final del año, en el 50% de telecentros de mineros artesanales las operadoras responsables son mujeres	50	Los centros de cómputo municipal de Otoa e Ingenio son atendidos por mujeres, así mismo lo son el telecentro de Santa Filomena y la cabina de San Luis.	4	40	36
		Al final del año 50% de telecentros se autofinancian y funcionan de manera sostenible.	100	Los telecentros de Santa filomena y Cerro Lunar se están autofinanciando con dificultades, pero con avance respecto al ejercicio anterior	1	100 (2)	50

Notas explicativas:

Anexo 1-Línea de acción 2

(2). El número de mineros artesanales/informales , directamente vinculados a las operaciones mineras, en el ámbito de acción de GAMA, es del orden de los 20,000.

Al sostener que existen 80 productores mineros artesanales registrados en el MEM, hay que tomar en consideración que generalmente cada productor minero artesanal calificado en realidad representa una persona jurídica de 50 personas en promedio, por lo tanto se totalizaría 3,500 mineros considerados como titulares es decir el 17.5% del total. El resto todavía esta en un proceso de organización incipiente a nivel de asociaciones,




Anexo 1-Línea de acción 3


(1) En general el nivel de organización ha aumentado en cuanto a las bases se refiere, pero acusa cierta debilidad en cuanto a sus centrales. Se considera meta superada en el 2007, tomando en consideración las agrupaciones de mineros informales existentes en la formulación del POF .Igual criterio, se asume para considerar como meta alcanzada en cuanto al POF.

Sin embargo continúan incorporándose mas agrupaciones minero artesanales y muchas de ellas articulándose bajo diferentes modelos organizativos , lo cual relativiza los indicadores formulados en el POF de la fase.

(2) Solamente 2 telecentros, el de Santa Filomena y el de Cerro Lunar depender en cierta medida de las organizaciones de mineros y con muchas dificultades como en el caso se Santa Filomena se están encaminando a saneara sus deudas. En el resto de puntos de acceso, por tratarse de instalaciones de iniciativa privada es obvio que tienen que autofinanciarse para garantizar su continuidad.

Anexo 3
Cuadros estadísticos

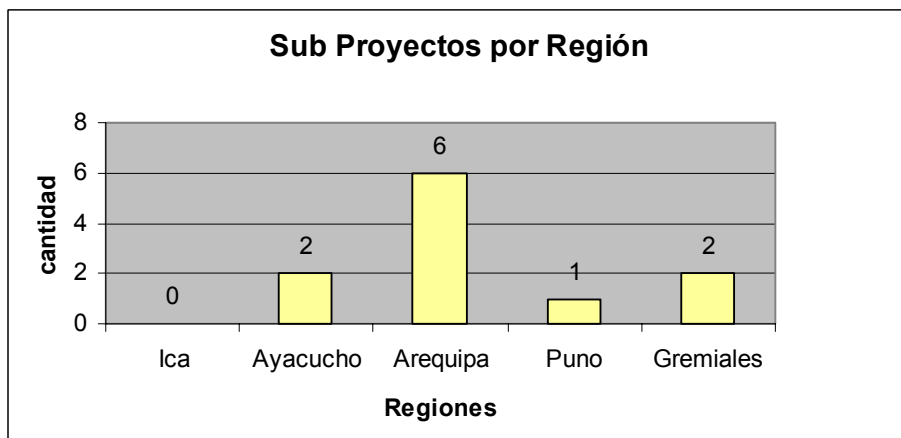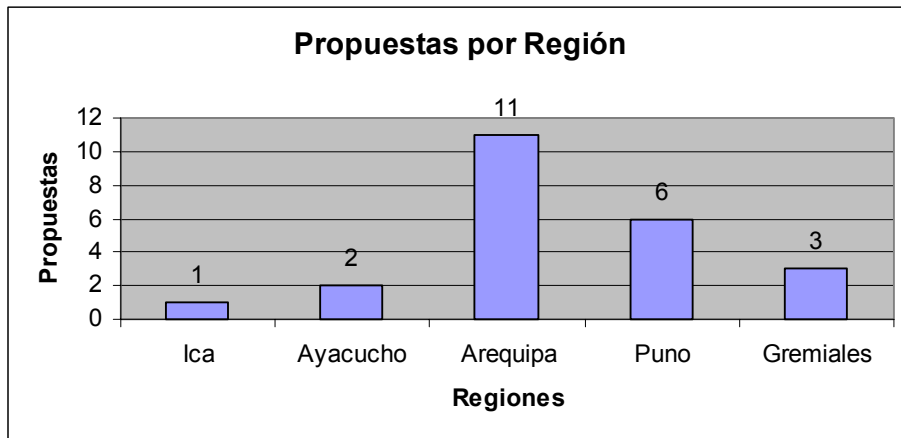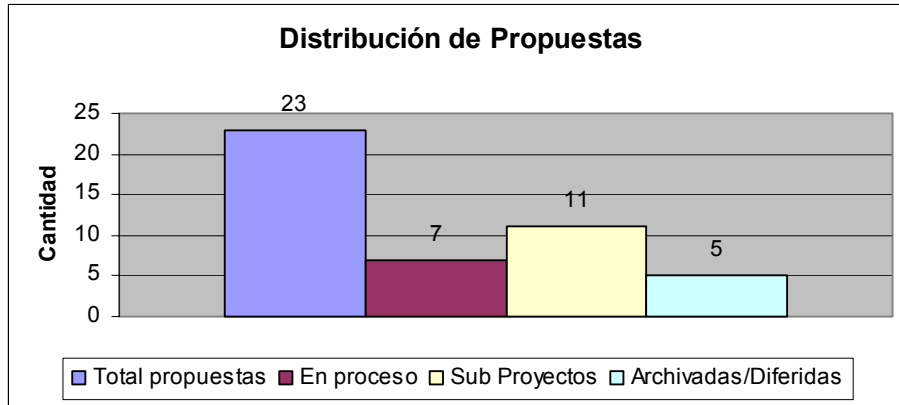

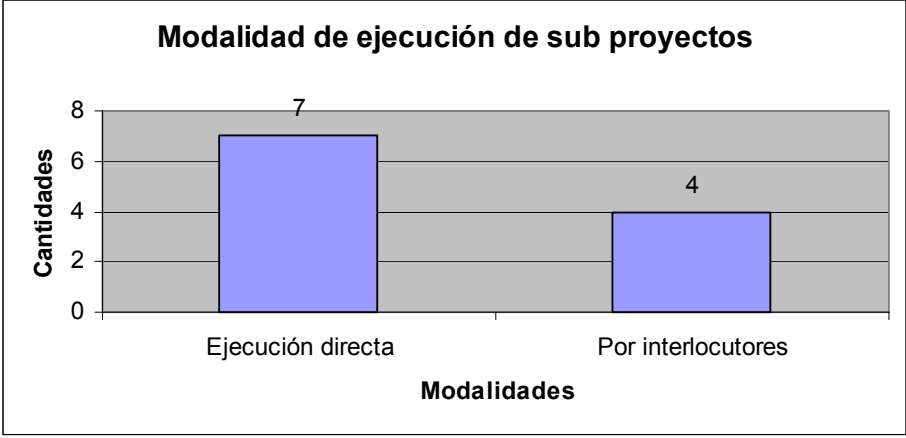

Anexo 4

PROYECTO GAMA ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2007

ACTIVIDAD REALIZADA	RESULTADO ALCANZADO
Enero	
Viaje a Arequipa y Puno: reuniones de representantes de GAMA con altos funcionarios regionales	Nuevos funcionarios ratifican posición como contrapartes de GAMA y designan representantes ante el C.D.
Viaje a Santa Filomena, apoyo al Telecentro.	Apoyo técnico en la configuración del sistema, Telecentro de Santa Filomena.
Microacción: Evaluación técnica y operativa de las retortas comunales de Mollehuaca Relave, Cháparra y Chala.	Informe
Se firmó Convenio de Apoyo para la implementación de Telecentro en la comunidad de Cerro Lunar. Rinconada,	Cooperativa Lunar de Oro y GAMA unen recursos para instalar un Telecentro de uso comunal en Cerro Lunar.
Acompañamiento a comunidades del sur Medio a ONG internacional Asociación Minería Responsable (ARM).	Se seleccionó comunidades pilotos para programa mundial de comercio justo para minería en pequeña escala.
Viaje de consultores en TIC: negociación con dueños de ca-binas Internet y capacitación en uso de GECO en El Ingenio	Convenios firmados con cabinas Silvernet de Tullín e Inge- nio y con la Municipalidad de Ingenio para difusión y uso de la plataforma GECO.
Contratación de consultor legal para asesoría en la redacción de un documento contractual entre cooperativistas de La Rinconada y la empresa Corporación Minera Ananea.	Se consolidó en una propuesta de contrato de explotación los acuerdos alcanzados, hasta ese momento, entre los cooperativistas mineros y la a empresa minera.
Febrero	
Viaje a Puno e instalación del cableado estructurado para el Telecentro en Cerro Lunar en Puno.	Asistencia técnica prestada a la Cooperativa Minera Lunar de Oro para contribuir al funcionamiento del Telecentro en esa comunidad minera.
Viaje a Ayacucho: entrevista con Gerente General del Gobierno Regional.	Nuevos funcionarios del Gobierno Regional conocen el Proyecto GAMA y designan representante ante el CD.
GAMA figura en el Directorio Minero Energético Ambiental (Publicación especializada en minería y energía)	GAMA gana institucionalidad en el sector Minero energé- tico Ambiental.
Se firma Convenio Tripartito entre Municipalidad e Otoca, Asociación de mineros de ASPROMAO y GAMA	Municipio, mineros organizados y GAMA unen esfuerzos para difusión y uso de plataforma GECO.
Marzo	
Viaje a Ica: entrevista con Gerente General del Gobierno Regional y con el Director de la DREM	Nuevos funcionarios informados sobre GAMA, ratifican convenio y GR designa representante ante el CD.
Equipo TIC de GAMA capacita sobre Plataforma GECO a mineros en Congreso de FENAMARPE	Se difunde plataforma GECO y se genera capacidades para su uso.
Concluye microacción financiada a AMASUC	Se cuenta con levantamiento topográfico de

para determinar ubicación con GPS de concesiones de empresas mineras.	labores mine- ras de las empresas de la comunidad de Relave - Ayacucho.
Merchandising para la Plataforma de Conocimientos GECCO: pads para mouse, lapiceros, bloks.	Se realiza difusión en diversas comunidades mineras e instituciones, sobre existencia de GECCO.
Viaje de monitoreo para firma /reforzamiento de convenios para difusión y uso de TICs en comunidades mineras	Se estableció relación con cabinas públicas de San Luís, apoyo técnico a Telecentro Santa Filomena y se evaluó el funcionamiento de cabina en Tulin.
Se llevó a cabo la 11va Mesa de Diálogo y Negociación de La Rinconada en Arequipa iniciándose la fase final del proceso	Se firmó acuerdo de intención sobre contratos a firmar, pro- grama de transferencia y acciones a realizar entre la empresa y los mineros artesanales.
Microacción: apoyo para viaje de delegación de mineros(as) a evento en Bolivia sobre estándar cero y comercio justo en minería en pequeña escala.	Mineros y mineras intercambian experiencias y avanzan en propuestas para inserción en economía formal con estándares adecuados y justos.
Funcionaria de COSUDE – Berna y Jefe de GAMA visitan comunidades minero artesanales	Sra. E. Vokral conoce comunidades de Tulin, San Luís y Santa Filomena y resultados que viene obteniendo GAMA.
Se contrato servicio de Internet para Telecentro de Cerro Lunar en La Rinconada – Puno.	Telecentro de Cerro Lunar cuenta con conectividad a TIC mediante señal de Internet.
Acciones de soporte técnico a telecentro municipal de Ingenio	Se ejecuta términos de convenio firmado con Municipalidad de Ingenio (Nasca) para impulsar uso de TIC por mineros.
Abril	
Jefe de Proyecto participa en Piura en Conversatorio sobre Minería Artesanal a pedido de Congresista de la Región.	Experiencia y conocimiento de GAMA sobre el tema es convocado por autoridades de otras regiones.
Reunión del Comité Directivo del Proyecto GAMA en Lima.	Se analizó y tomó acuerdos relevantes respecto al Informe Anual de Actividades 2006 y el Plan Operativo 2007.
Equipo de TICs viaja a Cerro Lunar para capacitar a los operadores de Telecentro.	Se transfieren capacidades a pobladores de Cerro Lunar para que operen el Telecentro.
Asistencia a la inauguración del Telecetno de Cerro Lunar	Telecentro comunal inicia operación en Cerro Lunar.
Capacitación en Juliaca a delegados de Cooperativas Mineras sobre acuerdos tomados en la 11ª MDyN	Mineros capacitados sobre derechos y obligaciones que implican los acuerdos tomados en la MDyN
Viaje del equipo TIC al Sur Medio: Otoa, Santa Filomena, Cuatro Horas.	Monitoreo de Telecentro y de aplicación de convenios para uso de TICs.
Equipo GAMA es convocado por SubComisión de Energía y Minas del Congreso.	Se toma en cuenta el enfoque y las sugerencias de GAMA para mejorar la Ley que regula la minería artesanal.
Apoyo técnico a Telecetno Municipal de Ingenio	Se implementan acuerdos de convenio firmado entre Municipalidad de Ingenio y GAMA respecto a Telecentro
Viaje a Arequipa de Gerenta de Operaciones para recabar información referente a auditoria especial de COSUDE	Se recopiló información para levantar observaciones de COSUDE
Publicación en el diario El Comercio de aviso de convocato- ria de proveedores de servicios para minería artesanal	Se busca ampliar la oferta de servicios a minería artesanal.

Se firma Convenio con cabina pública de uso de Internet de Rinconada para difusión y uso de página GECO.	Se amplia posibilidad de acceso al GECO en La Rinconada.
Mayo	
Viaje de Gerente de Operaciones a Arequipa en relación con auditoria especial solicitada por COSUDE.	Se concluyó de recopilar información para levantamiento de observaciones de COSUDE.
Microacción: "Capacitación en uso de TICs para dirigentes de la Asociación de Mujeres Mineras del Sur Medio".	Se capacitó a 6 dirigentes en el uso de PC y Plataforma GECO.
Se financió una beca de investigación en TIC y minería artesanal en el marco del Convenio firmado con SEPIA	SEPIA convocó y seleccionó investigador. Se inició la investigación sobre el Telecentro de Santa Filomena.
SubComisión de Energía y Minas del Congreso solicita opinión y propuestas de GAMA.	GAMA alcanza opinión y propuestas a congresistas sobre normatividad minero artesanal.
Participación en la Plenaria de Delegados impulsada por la MDyN en Juliaca	250 mineros(as) de La Rinconada fueron informados sobre acuerdos de la MDyN, los cuales ratificaron.
Se contrató Estudio de Abogados para que asesoría jurídica en la formulación de los contratos acuerdo entre actores principales de la MDyN.	Formulación de los contratos de compra/venta de acciones y acreencias entre empresa y mineros de La Rinconada, cuenta con asesoría legal imparcial.
Exposición pública en el Auditorio del MEM sobre el tema "GAMA: Componente TIC y Subproyectos".	Difusión y capacitación entre instituciones relacionadas a la minería artesanal, del eje transversal TICs.
Viaje de coordinación con organizaciones de mineros sobre funcionamiento de retortas comunales e iniciativas TIC.	Se impulsó firma de convenios y capacitación sobre TICs y se evaluó funcionamiento de retortas comunales: Otoa. Cuatro Horas, Mollehuaca y Relave.
Firma de convenio entre cabina pública de Internet ubicada en Cuatro Horas y GAMA	Se cuenta con conectividad para capacitar a mineros/as de Cuatro Horas en el uso de computadoras y de GECO.
Se llevó a cabo 12ª MDyN entre mineros de La Rinconada en la ciudad e Lima.	Última sesión realizada en la que se aprobó los términos de los contratos a ser suscritos y el cronograma de acciones hasta la firma de los contratos.
Junio	
Presentación de estrategia TIC y plataforma GECO en Puno	Se difundió Plataforma GECO en evento público.
Apoyo a evento sobre medio ambiente organizado por contraparte regional de Puno.	GAMA proyecta imagen como contraparte en evento regional por el Día Internacional del medio Ambiente.
Jóvenes de comunidades minero artesanales son capacitados en Taller de redacción Web realizado en Lima.	Se promueve capacidades en redacción Web en jóvenes mineros artesanales ganadores del concurso EXPRESATE
Diversas coordinaciones con mineros y empresa Rinconada en relación con acuerdos sobre contratos a firmar.	GAMA facilita último tramo de negociación.
Se realiza test sobre usabilidad del GECO en comunidades minero artesanales de Ica y Ayacucho	Se cuenta con información para la formulación de la investigación sobre usabilidad de plataforma GECO
Microacción: Apoyo y participación en el "I	GAMA contribuye a articulación entre minería

Encuentro Distrital de Mineros Artesanales del Valle de El Ingenio- Ica”	artesanal y autoridades locales.
Apoyo y participación en Audiencia Pública de Arequipa convocada por la Comisión de Energía y Minas del Congreso.	Autoridad legislativa convoca a GAMA para debatir ante autoridades y mineros mejoras en la Ley 27651.
Sistematización de experiencias en relación con la estrategia de TICs.	Documentos elaborados: “Primer estudio de Usabilidad de GECCO” y “Sistematización la experiencia de creación y desarrollo del Telecentro de Santa Filomena”.
Julio	
Apoyo y participación en audiencia pública sobre la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal organizada en Arequipa por la Comisión de Energía y Minas del Congreso.	Poder Legislativo solicita participación de GAMA para el debate público sobre mejoras en la legislación sobre minería artesana.
Participación en la misión GIAR a Rinconada y Cero Lunar.	Ayuda humanitaria a población minero artesanal del sur víctima del friaje.
Cumpliendo con el D.S N° 034-2007-EM del 04-07-2007 que aprobó el “Plan de Acción para la recuperación de la cuenca del Río Ramis” y la participación de GAMA se participó en la instalación de la Comisión especial en Puno.	Ente rector de minería en el país convoca a GAMA para que participe en la solución de un problema socio-ambiental en Puno originado por mineros artesanales. Se inicia Plan de Capacitación para la zona de Ananea-Puno.
Participación en la audiencia pública sobre la Ley de Minería Artesanal en Madre de Dios por la Comisión de Energía y Minas del Congreso.	El Proyecto GAMA se posiciona como referente nacional para el tema de minería artesanal.
Taller sobre técnicas de comunicación aplicadas a la Negociación, Facilitación y Resolución de conflictos	Dirigentes mineros de nueve organizaciones del Sur Medio se capacitan para negociar con titulares mineros.
Agosto	
Taller de Capacitación para mineros de Choco-Arequipa.	Micro acción implementada por el Gob Regional Arequipa capacitó a miembros de nueva empresa minero artesanal.
Asesoría y acompañamiento a La Central de Cooperativas Mineras de Rinconada por la firma de contratos de compra-venta de acciones y acreencias de la empresa titular de las concesiones mineras	Los mineros pasaron a ser accionistas mayoritarios de la empresa y de la Junta de Acreedores que la gobierna. Dan inicio a su formalización pasando a ser empresarios y titulares del yacimiento en que trabajan.
Acto Público de firma de los contratos de compra-venta de acciones y acreencias entre actores principales de la MDyN de La Rinconada, con presencia de altas autoridades.	Concluyó exitosamente el largo proceso de diálogo y negociación para la formalización de los mineros artesanales de La Rinconada.
Formulación del Informe de ejecución semestral POA 2007	Evaluación y seguimiento de cumplimiento de planes.
Participación en seminario organizado por la SNMPE, para funcionarios de la SUNAT	Difundir caracterización de la minería artesanal y acciones de GAMA en beneficio de este subsector
Setiembre	
Viaje con autoridad autónoma ambiental y Consejero Regional de Caraveli a diversas comunidades mineras de Arequipa. (Camaná,	Monitoreo y coordinación de subproyectos en conjunto con funcionarios y autoridades regionales permitió se coordinó con alcaldes

Condesuyos y Caravelí)	distritales de las zonas visitadas.
Viaje de Jefe de Proyecto a Reunión anual del CASM en Mongolia	Intercambio de experiencias sobre minería artesanal a nivel global permite apreciar liderazgo del Perú en el tema.
Publicación de artículo sobre formalización de mineros de La Rinconada en la revista EXPORTAR	Se difunde uno de los logros más importantes del Proyecto GAMA.
Viaje de coordinación con organizaciones de Mollehuaca, Cháparra y Tulin	Se estableció contacto con organizaciones mineras en nueva zona (Quicacha)
Publicación de artículo sobre GAMA en revista especializada PROACTIVO	Continúa difusión sobre formalización en La Rinconada.
Reunión del Comité Directivo del Proyecto GAMA	Se aprueba Informe Semestral.
Octubre	
Viaje a zonas de La Eugenia, Misky y Secocha.	Monitoreo de Subproyectos y evaluación de propuestas.
Participación en evento de capacitación organizado por la Federación Nacional de mineros artesanales del Perú.	Se difunde necesidad de avanzar en la formalización y el control ambiental entre nuevas organizaciones mineras.
Concluyo informe final de investigación "El empoderamiento como estrategia de lucha contra la pobreza"	Se cuenta con evidencias sobre resultados de la estrategia de empoderamiento en la lucha contra la pobreza.
Divulgación de acciones efectuadas por GAMA en su área de influencia dirigida a estudiantes de maestría de Derecho Ambiental de la PUCP.	Difusión de actividades de GAMA y de la naturaleza de la minería artesanal a un sector vinculado a aspectos ambientales, pero un tanto ajeno a este sector..
Noviembre	
Exposición sobre tecnologías limpias validadas por GAMA a estudiantes de metalurgia de la UNMSM.	Mayor difusión de alternativas técnicas adecuadas para la minería artesanal: "Retorta comunal " entre otras
Participación de GAMA como expositor en la reunión del Grupo de Diálogo Minero	GAMA participa en espacios de concertación y diálogo sobre minería.
A solicitud de un congresista se elabora la ayuda memoria: Incidencia de GAMA en la minería artesanal del Perú.	Interés de autoridades sobre los resultados alcanzados por GAMA.
Se inicio la Mesa de Diálogo y Negociación para formalización de la zona de Mucumayo-Valencia en Puno.	Nuevas iniciativas de mesas de diálogo y negociación que surgen de los propios interesados demuestran sostenibilidad de la experiencia de la MDyN de La Rinconada.
Se participa en Feria de Exposición de Tecnología promovida por la Universidad Católica.	Se difunde Plataforma GECO y se comparte stand con proveedor de equipo con tecnología adecuada para el beneficio de mineral a escala artesanal.
Diciembre	
GAMA expone en el Taller Internacional "Gestión de Ingresos generados por la minería y oportunidades de diversificación económica" organizado por UNCTAD- Naciones Unidas	Participación en foro internacional permite difundir la importancia económica y social de la minería artesanal para el Perú.
Evaluación de actividades para la formulación del Informe anual de actividades	Informe anual 2007 formulado.
